



PROYECTO: Solución e_Business Cines Unidos
REPORTE DE AVANCE AL 30-07-2007



¿Qué pasó? (Actividades realizadas desde el último seguimiento)

- * Cines Unidos revisó y aprobó el **Informe de Especificación de Requerimientos**
- * Se recibió feedback del **Informe de Infraestructura Recomendada**
- * Se completó configuración de reportes y estadísticas del CRM
- * Se llevó a cabo migración a nueva revisión de N2C (5.0f) para hacer uso de listas dependientes de 3 niveles.
- * Se realizaron pruebas y ajustes para funcionalidad en N2C 5.0f
- * Continuaron pruebas para facilidad de integración con Vista en laboratorio GWT (WebServices)
- * Se inició elaboración de la Guía de Usuarios CRM y Guía Técnica
- * Se elaboró Plan para Pruebas de Certificación CRM por parte de Cines Unidos
- * Se realizó la instalación de Asterisks y se preparó máquina virtual y se instaló en laboratorio.

¿Qué debería haber pasado? (Actividades planificadas en el periodo de revisión)


- * Carga inicial de datos en N2C de Clientes y Transacciones existentes en B.D Proveedor Actual. *19-06-2007*
- * Implementación de mecanismo de carga continua de datos provenientes del Proveedor Actual. *20-06-2007*
- * Implementación esquema de monitoreo de datos para su actualización. *21-06-2007*
- * Implementación de la facilidad de envío de correos masivos y monitoreo de emails (Email Marketing). *21-06-2007*

Áreas de Atención

- * Carga de datos Proveedor Actual --> N2C
- * Email Marketing

¿Cuáles son las Próximas Actividades ? (Tareas y Responsables)

- * Complementar Informe Infraestructura con recomendación emitida por Cines Unidos. *Resp. GWT. Fecha: 01-08-2007*
- * Continuar actividad de integración de Net2Client con aplicación Vista. *Resp. GWT.*
- * Adiestramiento al equipo CU que participará en las pruebas de Certificación. *Resp. Todos. Fecha: 02-08-2007*
- * Elaborar programa como mecanismo de carga de los datos provenientes del Proveedor Actual en el CRM. *Resp. GWT*
- * Continuar elaboración de la Guía de Sistemas CRM. *Resp. GWT. Fecha: 08-08-2007*
- * Realizar carga inicial de datos y transacciones existentes en la base de datos del Proveedor Actual. *Resp. GWT.*
- * Iniciar pruebas con Asterisk en servidor de GWT. *Resp. GWT.*
- * Realizar Pruebas de Certificación CRM. *Resp. CU. Fecha inicio: 06-08-2007*
- * Próxima reunión: **13-08-2007**

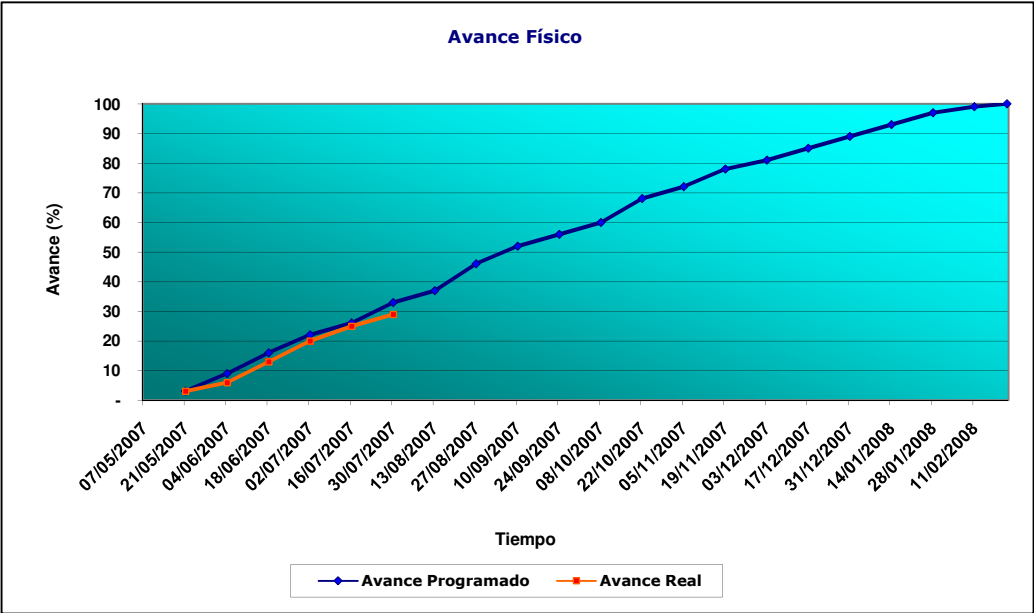

Fecha	21-may	4-jun	18-jun	2-jul	16-jul	30-jul	13-ago	27-ago	10-sep	24-sep
Plan	3,00	9,00	16,00	22,00	26,00	33,00	37,00	46,00	52,00	56,00
Real	3,00	6,00	13,00	20,00	25,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fecha	8-oct	22-oct	5-nov	19-nov	3-dic	17-dic	31-dic	14-ene	28-ene	11-feb
Plan	60,00	68,00	72,00	78,00	81,00	85,00	89,00	93,00	97,00	99,00
Real	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fecha	22-feb
Plan	100,00
Real	0,00

Leyenda	
●	Desviación <= 5%
●	Desviación > 5% y Desviación <= 10%
●	Desviación > 10%
