

¿Qué pasó? (Actividades realizadas desde el último seguimiento):

- Finalización del bloque de Facturación PDVSA
- Definición y desarrollo de Reportes
- Pruebas de Certificación

¿Qué debería haber pasado?


Ya deberíamos estar preparando el pase a producción

¿Por qué tenemos una diferencia entre lo que pasó y lo que debería haber pasado? (Incluir Áreas de Atención)

Retraso acumulado. Posibilidad del cliente de hacer pruebas de certificación de lo ya culminado.

¿Qué debemos hacer para mantenernos dentro del Plan? (Próximas Actividades y Responsables)

Se cuenta con una persona de apoyo en un 50% de disponibilidad diaria para contribuir a recuperar tiempo.
 Las pruebas de certificación y enviar pronto cualquier observación.
 Aclarar el punto referente a totales por detalle en impreso de factura.
 Se requiere que se vayan especificando los reportes, de modo que al alcanzar esa actividad no se tenga que esperar por definición.
 Punto Atención: 15% de atraso (estamos en rojo) se requiere de la colaboración de todos.

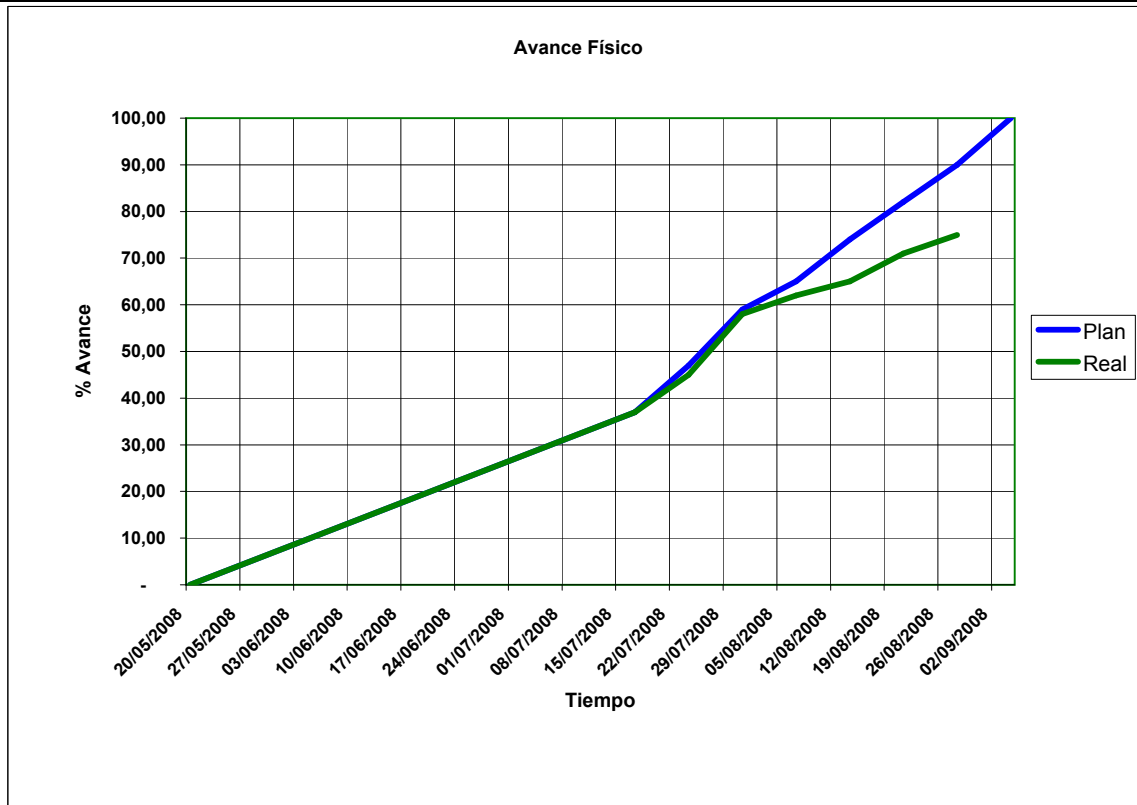

Fecha	17-jul	24-jul	31-jul	7-ago	14-ago	21-ago	28-ago	4-sep		
Programado	37,00	47,00	59,00	65,00	74,00	82,00	90,00	100,00		
Real	37,00	45,00	58,00	62,00	65,00	71,00	75,00	0,00		



Leyenda	
	Desviación ≤ 5%
	Desviación > 5% y Desviación ≤ 10%
	Desviación > 10%
