

¿Qué pasó? (Actividades realizadas desde el último seguimiento):

- No se ha avanzado porque no se tienen los suministros para la tarea que falta que se refiere a generación de reportes

¿Qué debería haber pasado?


GWT debió recibir las especificaciones de los 5 reportes que se deben desarrollar, por parte del equipo de Hertz

¿Por qué tenemos una diferencia entre lo que pasó y lo que debería haber pasado? (Incluir Áreas de Atención)

- No se han desarrollado los reportes
- No se han finalizado las pruebas de certificación

¿Qué debemos hacer para mantenernos dentro del Plan? (Próximas Actividades y Responsables)

Ya el plan no se puede cumplir. Para finalizar el proyecto se requiere contar con las especificaciones de los reportes a desarrollar y luego de ello, se deben finalizar las pruebas de certificación por parte de Hertz y hacer los ajustes que sean necesarios, en caso que se requieran, a raíz de las pruebas.

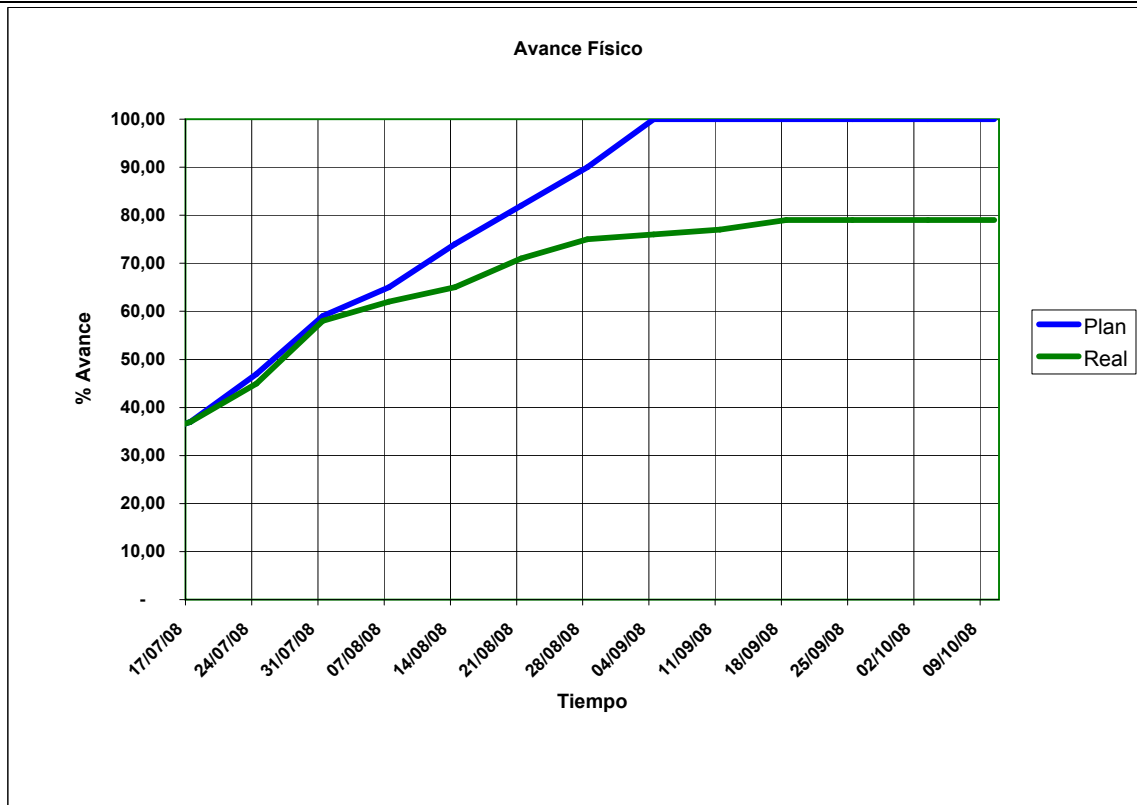

Fecha	17-jul	24-jul	31-jul	7-ago	14-ago	21-ago	28-ago	4-sep	11-sep	18-sep
Programado	37,00	47,00	59,00	65,00	74,00	82,00	90,00	100,00	100,00	100,00
Real	37,00	45,00	58,00	62,00	65,00	71,00	75,00	76,00	77,00	79,00

Fecha	25-sep	3-oct	10-oct							
Programado	100,00	100,00	100,00							
Real	79,00	79,00	79,00							



Leyenda	
	Desviación <= 5%
	Desviación > 5% y Desviación <= 10%
	Desviación > 10%
