



CINES UNIDOS
REPORTE PERIODO: 01 Oct al 07 Oct



¿Qué pasó? (Actividades realizadas desde el último seguimiento):

- Se hizo replanificación luego de revisión del ambiente de desarrollo y de programas que se tenían por culminados, además se ingresaron las actividades de upgrade de versión de la plataforma y se incorporaron ajustes en el Módulo de Contacto por nuevos requerimientos de Cines Unidos
- Se culminó el Módulo de Contacto e iniciaron por parte de Cines Unidos las pruebas de Certificación, hasta la fecha no se han obtenido observaciones

¿Qué debería haber pasado?


N/A

¿Por qué tenemos una diferencia entre lo que pasó y lo que debería haber pasado? (incluir Áreas de Atención)

N/A

¿Qué debemos hacer para mantenernos dentro del Plan? (Próximas Actividades y Responsables)

- GWT ya tomó nuevas medidas respecto al equipo de desarrollo. Queda seguir el plan que se obtuvo de la replanificación para no pasar de diciembre de este año.

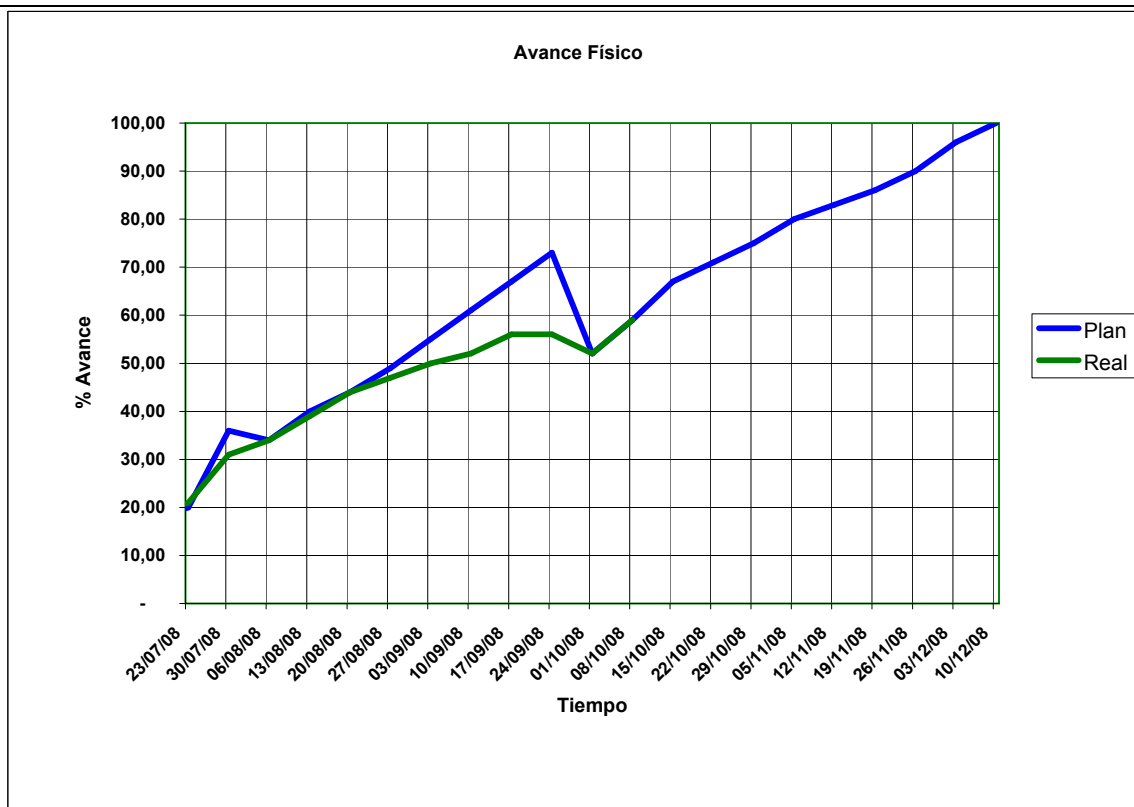

Fecha	23-jul	30-jul	6-ago	13-ago	20-ago	27-ago	3-sep	10-sep	17-sep	24-sep
Programado	20,00	36,00	34,00	40,00	44,00	49,00	55,00	61,00	67,00	73,00
Real	21,00	31,00	34,00	39,00	44,00	47,00	50,00	52,00	56,00	56,00

Fecha	1-oct	8-oct	15-oct	22-oct	29-oct	5-nov	12-nov	19-nov	26-nov	3-dic
Programado	52,00	59,00	67,00	71,00	75,00	80,00	83,00	86,00	90,00	96,00
Real	52,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Replanificación

Legenda



|Desviación| <= 5%



|Desviación| > 5% y |Desviación| <= 10%



|Desviación| > 10%
