



CINES UNIDOS  
REPORTE PERIODO: 03 Dic al 14 Ene



¿Qué pasó? (Actividades realizadas desde el último seguimiento):

- Pruebas internas de integraciones con Tiendas, Sitio web y Vista
- Preparación para puesta en producción de Integraciones antes mencionadas
- Carga inicial de datos de Clientes de Tiendas en producción
- Carga de Transacciones de Tienda en desarrollo

¿Qué debería haber pasado?


- Carga inicial de Tiendas (transacciones) en producción
- Recepción de archivos .mdb de Sitio web en Cines Unidos a ser enviada por Cavallin
- Carga inicial de Clientes y Transacciones de Sitio web
- Carga inicial de datos de Vista
- Recepción en GWT de información solicitada sobre CC Vista

¿Por qué tenemos una diferencia entre lo que pasó y lo que debería haber pasado? (Incluir Áreas de Atención)

- No se cumplieron las tareas planificadas de Diciembre

¿Qué debemos hacer para mantenernos dentro del Plan? (Próximas Actividades y Responsables)

- Culminar las tareas que se dejaron pendientes de Diciembre
- Recibir información solicitada sobre CC Vista

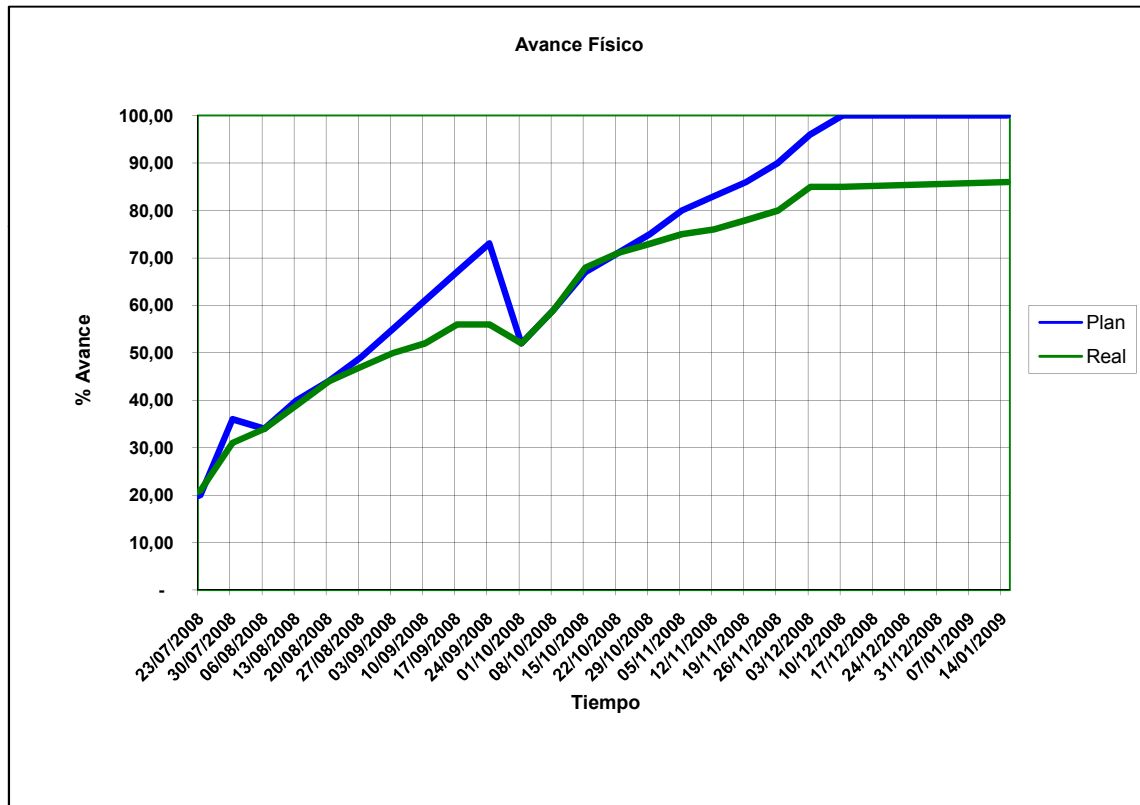

| Fecha      | 1-oct | 8-oct | 15-oct | 22-oct | 29-oct | 5-nov | 12-nov | 19-nov | 26-nov | 3-dic |
|------------|-------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|-------|
| Programado | 52,00 | 59,00 | 67,00  | 71,00  | 75,00  | 80,00 | 83,00  | 86,00  | 90,00  | 96,00 |
| Real       | 52,00 | 59,00 | 68,00  | 71,00  | 73,00  | 75,00 | 76,00  | 78,00  | 80,00  | 85,00 |

| Fecha      | 10-dic | 15-ene |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Programado | 100,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Real       | 85,00  | 86,00  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Replanificación

Leyenda



[Desviación] <= 5%



[Desviación] > 5% y [Desviación] <= 10%



[Desviación] > 10%
