



CINES UNIDOS
REPORTE PERIODO: 10 Sep al 16 Sep



¿Qué pasó? (Actividades realizadas desde el último seguimiento):

- Se culminaron los ajustes en el Módulo de Contacto
- Pase de conocimientos de personal anterior al nuevo

¿Qué debería haber pasado?

- **Haber puesto en producción Módulo de Contacto**

- Haber ajustado la integración con Sitio Web con las listas de valores de Ciudad, Estado y Cinesmas reales
- Haber finalizado la integración con Transacciones Web
- Haber finalizado desarrollo de Integración con Vista

¿Por qué tenemos una diferencia entre lo que pasó y lo que debería haber pasado? (Incluir Áreas de Atención)

- Retrasos en Ajustes del Módulo de Contacto en Pippin


¿Qué debemos hacer para mantenernos dentro del Plan? (Próximas Actividades y Responsables)

- **Sigue pendiente:**

Obtener lista de valores de Estados

Obtener diccionario de datos de la tabla de transacciones

- GWT ya tomó medidas respecto al equipo de desarrollo

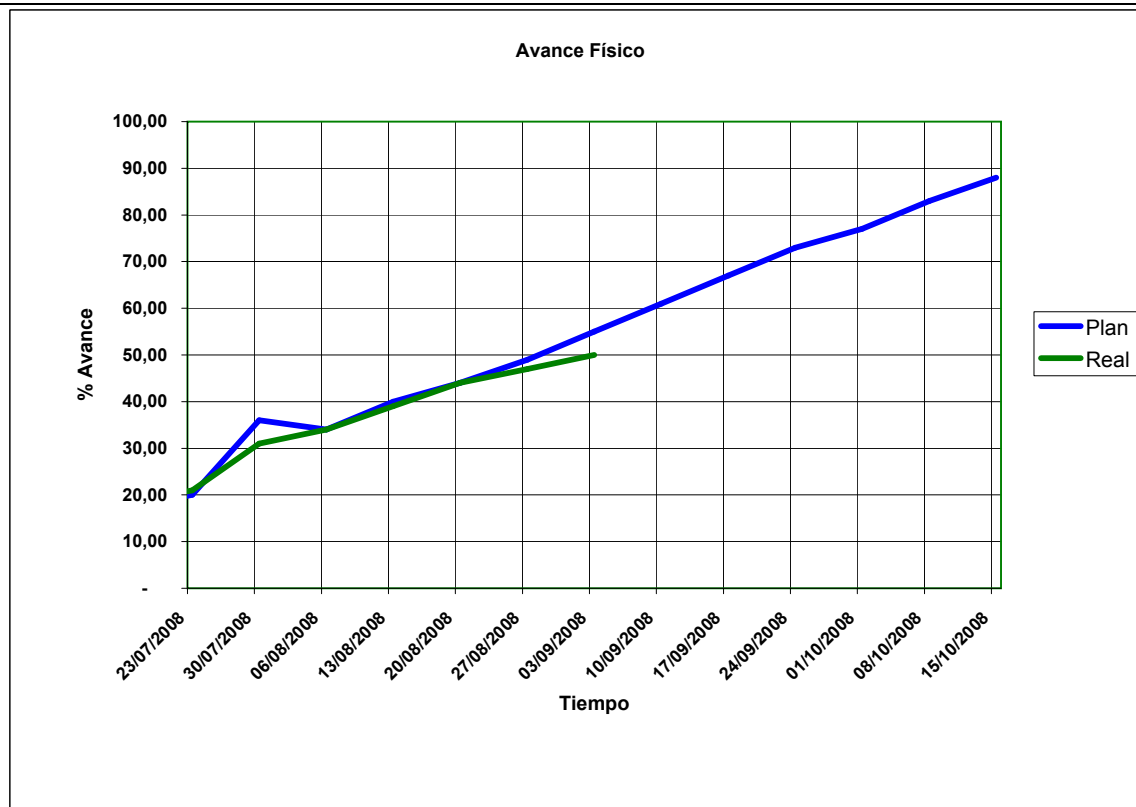

Fecha	23-jul	30-jul	6-ago	13-ago	20-ago	27-ago	3-sep	10-sep	17-sep	24-sep
Programado	20,00	36,00	34,00	40,00	44,00	49,00	55,00	61,00	67,00	73,00
Real	21,00	31,00	34,00	39,00	44,00	47,00	50,00	52,00	56,00	0,00



Fecha	1-oct	8-oct	15-oct	22-oct	29-oct					
Programado	77,00	83,00	88,00	93,00	100,00					
Real	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Replanificación

Leyenda	
	Desviación <= 5%
	Desviación > 5% y Desviación <= 10%
	Desviación > 10%
