



CINES UNIDOS
REPORTE PERIODO: 21 Ene al 27 Ene



¿Qué pasó? (Actividades realizadas desde el último seguimiento):

- Recepción por parte de GWT de los archivos .mdb de Sitio web.
- Revisión y análisis de estructura de archivos recibidos
- Reintentos de carga de Transacciones de Tiendas

¿Qué debería haber pasado?


- Carga inicial de Tiendas (transacciones) en producción
- Recepción de archivos .mdb de Sitio web con estructura original de desarrollo
- Carga inicial de Clientes y Transacciones de Sitio web
- Carga inicial de datos de Vista
- Recepción en GWT de información solicitada sobre CC Vista

¿Por qué tenemos una diferencia entre lo que pasó y lo que debería haber pasado? (Incluir Áreas de Atención)

- No se ha logrado correr completamente la integración de transacciones de Tiendas por capacidad del servidor Pippin
- La estructura de los archivos .mdb de Sitio web no cumplen con la estructura especificada necesaria para la integración
- No se ha obtenido la información solicitada sobre CC Vista

¿Qué debemos hacer para mantenernos dentro del Plan? (Próximas Actividades y Responsables)

- Recibir información solicitada sobre CC Vista
- Lograr la ejecución completa de la integración de transacciones de Tiendas
- Recibir los archivos .mdb de Sitio web con la estructura correcta
- Hacer la carga de Vista una vez se culmine la de Sitio web

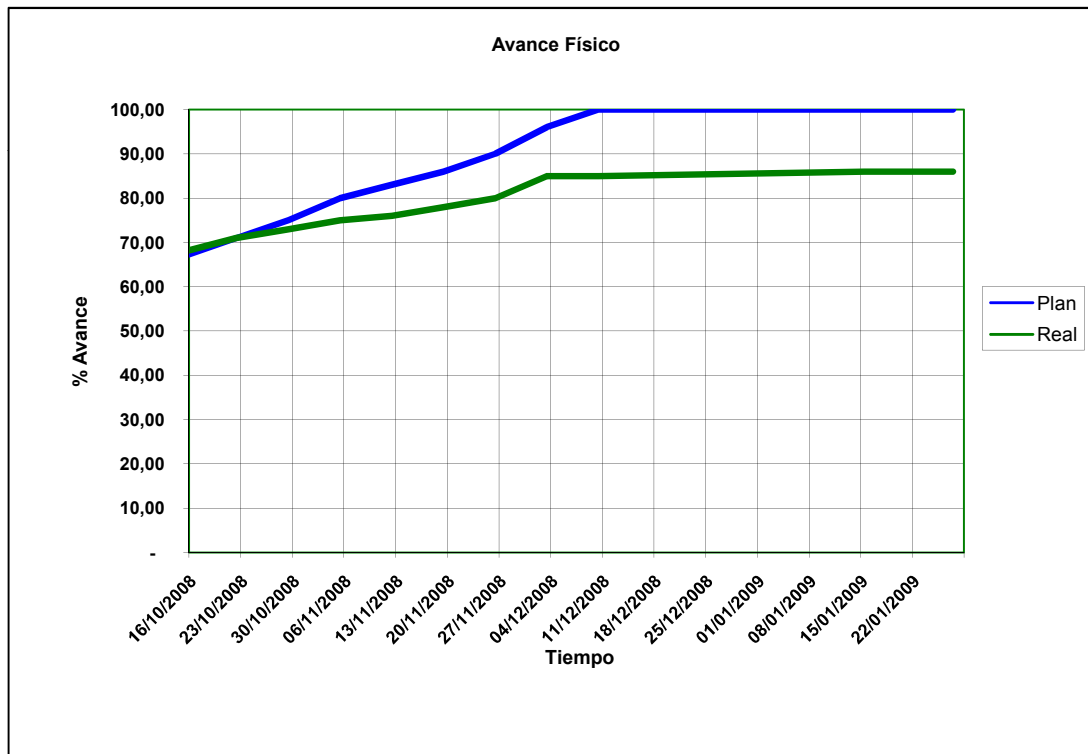

Fecha	1-oct	8-oct	15-oct	22-oct	29-oct	5-nov	12-nov	19-nov	26-nov	3-dic
Programado	52,00	59,00	67,00	71,00	75,00	80,00	83,00	86,00	90,00	96,00
Real	52,00	59,00	68,00	71,00	73,00	75,00	76,00	78,00	80,00	85,00

Fecha	10-dic	15-ene	20-ene	27-ene						
Programado	100,00	100,00	100,00	100,00						
Real	85,00	86,00	86,00	86,00						

Replanificación



Leyenda	
	Desviación ≤ 5%
	Desviación > 5% y Desviación ≤ 10%
	Desviación > 10%
