



CINES UNIDOS
REPORTE PERIODO: 23 Jul al 29 Jul



¿Qué pasó? (Actividades realizadas desde el último seguimiento):

- Se trabajó en la actividad referente a Integración con Sitio Web mediante archivo .mdb
- Se trabajó en Integración con Asterisk

¿Qué debería haber pasado?


Tener mayor avance en las actividades de Integración con Sitio Web e Integración con Asterisk

¿Por qué tenemos una diferencia entre lo que pasó y lo que debería haber pasado? (Incluir Áreas de Atención)

Dedicación del Desarrollador en el proyecto. El desarrollador se encuentra de permiso porque su esposa dio a luz y quien lo está sustituyendo tiene que cubrir la curva de aprendizaje, lo cual retrasa un poco las actividades.

¿Qué debemos hacer para mantenernos dentro del Plan? (Próximas Actividades y Responsables)

Una vez se reintegre el desarrollador (el 07 de agosto) retomaremos con velocidad las actividades para ajustarnos de nuevo al plan.

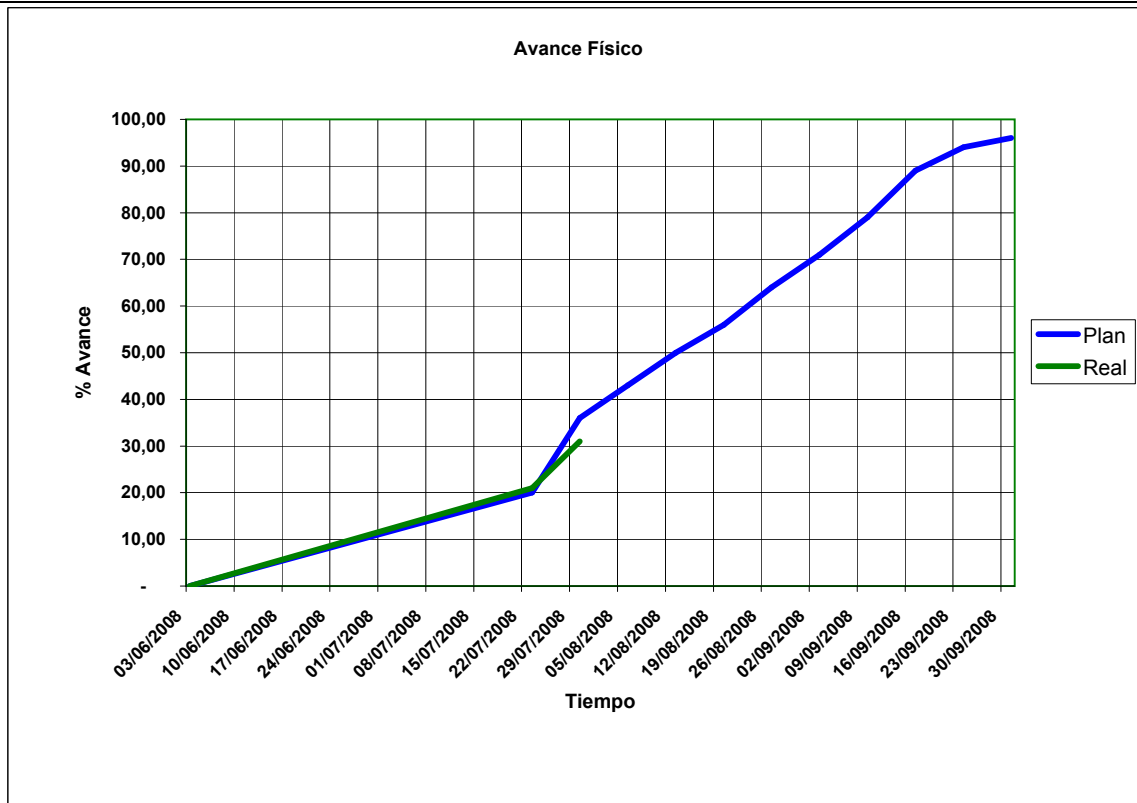

Fecha	23-jul	30-jul	6-ago	13-ago	20-ago	27-ago	3-sep	10-sep	17-sep	24-sep
Programado	20,00	36,00	43,00	50,00	56,00	64,00	71,00	79,00	89,00	94,00
Real	21,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Leyenda	
	Desviación <= 5%
	Desviación > 5% y Desviación <= 10%
	Desviación > 10%
