

REPORTE DE AVANCE

PERIODO: 15 Mayo al 15 Julio

Actividades realizadas desde el último seguimiento

Registro y secciones privadas

Google analytics

Ingreso de Contenido por parte de Cyngular

Revisión por parte de Cyngular

Ajustes

Producto: SITIO WEB CON REGISTRO en ambiente de desarrollo

Cambio Encabezado

Cambio Banners

Boletines

Tabla de personas para envío de boletines

Programa para marcar no recibir más boletines

Puesta en producción Primera parte

Producto SITIO WEB PUBLICADO en Producción

Recomendar blog al editor

Proposición de noticia

Proposición de evento

Suscripción

Formulario de suscripción

Formulario para registro de pago

Revisión por parte de Cyngular

Ajustes

Producto: SITIO WEB COMPLETO en ambiente de desarrollo

Backoffice

Módulo de manejo de contenido publicado por usuarios

Manejo de Suscripciones

Manejo de Pagos pendientes y aprobación de pagos

Reportes básicos por tabla

Pruebas internas y ajustes

Guía de Usuario

Adiestramiento Usuario Backoffice

Adiestramiento Administrador Backoffice

Pruebas de Certificación de Cyngular

Ajustes

Producto: SITIO WEB COMPLETO en ambiente de Producción

Gerencia de proyectos

¿Qué debería haber pasado?

SITIO WEB COMPLETO en ambiente de Producción, el cual se completo a satisfacción del Cliente

¿Por qué hubo diferencia entre la planificación del baseline y lo ejecutado?


Hubo un Control de Cambio donde se adelantó la entrega del Sitio Web Público a Producción en componentes parciales.

Se ejecutaron los cambios planificados en base a las nuevas actividades programadas por el Control de Cambio

Próximas Actividades y Responsables

Cierre Administrativo del Proyecto. (GlobalWebTek y Cyngular)

Gráfico de Avance

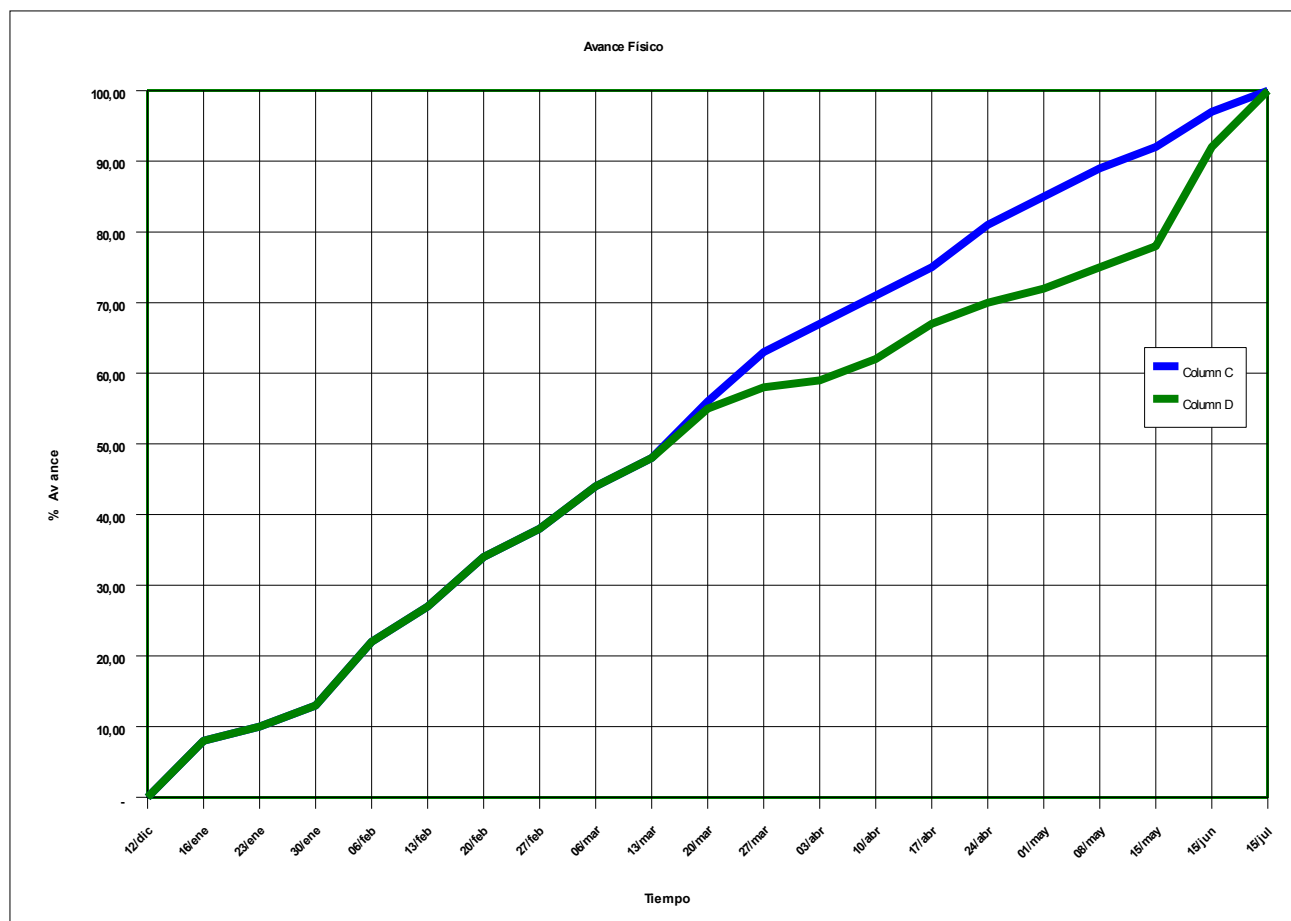

Fecha	20-mar	27-mar	3-abr	10-abr	17-abr	24-abr	1-may	8-may	15-may	15-jun	15-jul
Programado	56	63	67	71	75	81	85	89	92	97	100
Real	55	58	59	62	67	70	72	75	78	92	100



Leyenda	
	Desviación ≤ 5%
	Desviación > 5% y Desviación ≤ 10%
	Desviación > 10%
