

¿Qué pasó? (Actividades realizadas desde el último seguimiento)

- * Se atendieron los siguientes PR's: PR 329, PR 87, PR 259, PR 276, PR 304, PR 337, PR 256, PR 22, PR 59, PR 5, PR 278, PR 240, PR 258, PR 268, PR 7, PR 89, PR 17, PR 372, PR 94, PR 280, PR 96, PR 103, PR 193
- * Completadas 100% de las Ordenes Individuales recibidas
- * Se atendieron calamidades reportadas (Total 3 calamidades). Problema en la emisión de ordenes (Codigo Postal) y respuesta a preguntas (Suscripción)
- * Se han realizado pruebas para tratar de reproducir el problema reportado en el PR 132 y todo funcionó OK

¿Qué debería haber pasado? (Actividades planificadas en el periodo de revisión)


- * Completar el PR 10
- * Recepción del material solicitado en reuniones anteriores
- * Feedback sobre la mejora realizada para el ingreso de las páginas de contenido
- * Decisión sobre la forma en que se quieren implementar los bordes. Se envió documento el 03-07-2006 y el lunes 02-10-2006 revisando la aplicación nos encontramos con algunas especificaciones que se deben aclarar.
- * PR 273 - Recepción del Botón

Áreas de Atención

- * Se requiere definir / aclarar cuándo un requerimiento es una **Calamidad** y cuándo es una **Orden Individual** o un **PR** que puede atenderse con menor celeridad. Documentarlo, incorporarlo como ayuda, para que todos trabajemos bajo el mismo esquema.
- * Aclarar la clasificación 999 que se asigna a los PR's
- * Se recomienda colocar un reporte de orden individual por registro
- * Para el PR 10 se establecerá una fecha tope de recepción del material. Acción de no recibirlo?
- * El PR 372, por parte de GWT está resuelto. Las mejoras en las funcionalidades serán cubiertas en una segunda Fase ya que requiere una alta inversión de esfuerzo, cambios sustanciales y complejos. Mientras, se deben regenerar las ordenes por BackOffice tal como ya se ha explicado.
- * Existen muchos PR's que están a la espera de discusión. Se debe agilizar esto (185, 14, 54, etc.)
- * Se debe resolver la discrepancia entre el listado de PR's del 04 de Septiembre (fecha de corte) construida con Kathy y la lista de PR's reportados en el sistema para el mismo periodo de tiempo (hav 10 PR's de diferencia).

¿Cuáles son las Próximas Actividades ? (Tareas y Responsables)

- * Solicitar a FotoXS el material requerido para la atención de los PR's. *Resp. Kathy. Fecha: 06-10-2006*
- * Solicitar aclaratoria a FotoXS para la implementación de los bordes (PR 3). *Resp. Kathy. Fecha: 06-10-2006*
- * Solicitar "TTF" que tenga los caracteres para solventar PR 316. *Resp. Kathy. Fecha: 06-10-2006*
- * Reunión para discutir los siguientes aspectos: Implementación de bordes (PR3), Órdenes individuales sin aprobación de FotoXS, Discrepancia entre lista de PR al 04-09 y la lista de PR to go. *Resp. Kathy, Gustavo, Beta. Fecha: 09-10-2006 10:00 a.m.*
- * Validar con FotoXS, en cuanto a la migración a WIB3, si se van a actualizar las páginas de contenido o si se van a lanzar con el material anterior. *Resp. Kathy. Fecha: 06-10-2006*
- * Recepción en GWT del material pendiente y aclaratorias para la atención de PR's. *Resp. Kathy. Fecha: 12-10-2006*

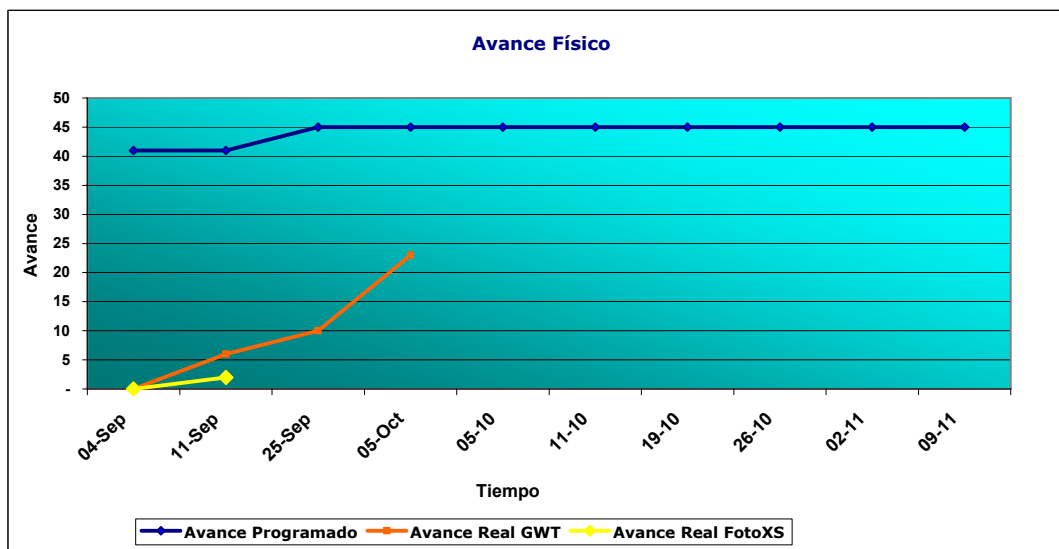

Fecha	4-Sep	11-Sep	25-Sep	5-Oct	05-10	11-10	19-10	26-10	02-11
Programado	41,00	41,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
Real GWT	0,00	6,00	10,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Real FXS	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leyenda	
● (Green)	Desviación <= 5%
● (Yellow)	Desviación > 5% y Desviación <= 10%
● (Red)	Desviación > 10%
