




























ID	Nombre de tarea	Duration	Start	Work	Finish	Pred	Fri 04 Au	Sun 06 A	Tue 08 A
1	Total Dealer's Website	35,75 days?	Mon 23/10/06	298 hrs	Mon 11/12/06				
2	Kickoff meeting	2 hrs	Mon 23/10/06	4 hrs	Mon 23/10/06				
3	Follow up sessions	10,13 days	Mon 30/10/06	6 hrs	Mon 13/11/06				
4	Work session #1	0,13 days	Mon 30/10/06	2 hrs	Mon 30/10/06				
5	Work session #2	0,13 days	Mon 06/11/06	2 hrs	Mon 06/11/06				
6	Work session #3	0,13 days	Mon 13/11/06	2 hrs	Mon 13/11/06				
7	Requirements	14,5 days	Tue 24/10/06	38,4 hrs	Mon 13/11/06				
8	Analysis and Requirements Elicitation	0,33 days	Tue 24/10/06	8 hrs	Tue 24/10/06				
9	Requirements Specifications	0,33 days	Tue 24/10/06	8 hrs	Tue 24/10/06	8			
10	Requirement Specifications Report Elaboration	5 days	Tue 24/10/06	8 hrs	Tue 31/10/06	9			
11	<i>Document Turn in to the Total Project Team for revision</i>	<i>0 days</i>	<i>Tue 31/10/06</i>	<i>0 hrs</i>	<i>Tue 31/10/06</i>	<i>10</i>			
12	Total Project Team's document revision	0 days	Tue 31/10/06	0 hrs	Tue 31/10/06	11			
13	<i>Recommended document adjustments reception</i>	<i>8 days</i>	<i>Wed 01/11/06</i>	<i>6,4 hrs</i>	<i>Fri 10/11/06</i>	<i>12</i>			
14	Requirement Specification Report Adjustements	0,5 days	Mon 13/11/06	8 hrs	Mon 13/11/06	13			
15	<i>Document Turn in to the Total Project Team for approval</i>	<i>0 days</i>	<i>Mon 13/11/06</i>	<i>0 hrs</i>	<i>Mon 13/11/06</i>	<i>14</i>			
16	Requirement Specification Report Approval	0 days	Tue 07/11/06	0 hrs	Tue 07/11/06				
17	Requirement Specification Report Approved	0 days	Tue 07/11/06	0 hrs	Tue 07/11/06	16			
18	Base information preparation for the implementation	1,25 days	Tue 07/11/06	13 hrs	Wed 08/11/06				
19	Data Model Definition and Documentation	0,75 days	Tue 07/11/06	12 hrs	Tue 07/11/06				
20	BackOffice Profiles Definition	0,25 days	Wed 08/11/06	1 hr	Wed 08/11/06				
21	Design Specifications	1 day?	Tue 07/11/06	8,8 hrs	Tue 07/11/06				
22	Design Document turn in (colors, typography, images, web	1 day?	Tue 07/11/06	0,8 hrs	Tue 07/11/06				
23	Configuration and Development	22 days	Wed 08/11/06	167 hrs	Thu 07/12/06	21			
24	WIB3 Application Configuration	0,5 days	Wed 08/11/06	2 hrs	Wed 08/11/06				
25	N2C Application Configuration	0,5 days	Thu 09/11/06	2 hrs	Thu 09/11/06				
26	WIB3 Configuration	5 days	Thu 09/11/06	20 hrs	Wed 15/11/06				
27	General Web Site Template Definition (Page Divisions, General Style, Site Assistant)	4 days	Thu 09/11/06	16 hrs	Tue 14/11/06				
28	Page Definition (Content Pages, Application Pages)	1 day	Wed 15/11/06	4 hrs	Wed 15/11/06	27			
29	Functionalities Implementation	18 days	Tue 14/11/06	143 hrs	Thu 07/12/06				
30	News	1,5 days	Tue 14/11/06	16 hrs	Wed 15/11/06				
31	Public Home and User Home News	1 day	Tue 14/11/06	12 hrs	Tue 14/11/06				

Proyecto: Proyecto CRM - Corpor Fecha: Tue 24/10/06	Tarea		Hito		Tareas externas	
	División		Resumen		Hito externo	
	Progreso		Resumen del proyecto		Fecha límite	










ID	Nombre de tarea	Duration	Start	Work	Finish	Pred	Fri 04 Au	Sun 06 A	Tue 08 A
32	Dealerpanel News	0,5 days	Wed 15/11/06	4 hrs	Wed 15/11/06	31			
33	Public Home and User Home Poll	1,5 days	Wed 15/11/06	12 hrs	Thu 16/11/06				
34	Marketing Actions	1 day	Fri 17/11/06	16 hrs	Fri 17/11/06				
35	Pulbic and User Home Marketing Actions	0,5 days	Fri 17/11/06	12 hrs	Fri 17/11/06				
36	Retail-Marketing Actions	0,5 days	Fri 17/11/06	4 hrs	Fri 17/11/06	35			
37	Login/Logout/ Password Change	1 day	Mon 20/11/06	4 hrs	Mon 20/11/06				
38	User Registration	1,5 days	Tue 21/11/06	12 hrs	Wed 22/11/06	37			
39	Price Chart (Like to have)	1 day	Wed 22/11/06	8 hrs	Wed 22/11/06				
40	Links Page (Linkpagina)	1 day	Thu 23/11/06	4 hrs	Thu 23/11/06	39			
41	Mailings	4 days	Fri 24/11/06	16 hrs	Wed 29/11/06				
42	User home Mailing	2 days	Fri 24/11/06	8 hrs	Mon 27/11/06				
43	Retail-Marketing Mailing	0,25 days	Tue 28/11/06	1 hr	Tue 28/11/06	42			
44	Retail-Top Service & Training Mailing	0,25 days	Tue 28/11/06	1 hr	Tue 28/11/06	43			
45	Retail-Shop Food & Services Mailing	0,25 days	Tue 28/11/06	1 hr	Tue 28/11/06	44			
46	Retail-Enginoring Mailing	0,25 days	Tue 28/11/06	1 hr	Tue 28/11/06	45			
47	Retail-Customer Service Mailing	0,25 days	Wed 29/11/06	1 hr	Wed 29/11/06	46			
48	Retail-Power Points Mailing	0,25 days	Wed 29/11/06	1 hr	Wed 29/11/06	47			
49	Cards Mailings	0,25 days	Wed 29/11/06	1 hr	Wed 29/11/06	48			
50	Lubricants Mailings	0,25 days	Wed 29/11/06	1 hr	Wed 29/11/06	49			
51	Pesonal Agenda	1 day	Wed 29/11/06	8 hrs	Wed 29/11/06				
52	Meeting Agenda	2 days	Thu 30/11/06	16 hrs	Fri 01/12/06				
53	Contact Forms	3,75 days	Mon 04/12/06	15 hrs	Thu 07/12/06				
54	Retail-Sales Contact	1,5 days	Mon 04/12/06	8 hrs	Tue 05/12/06				
55	Retail-Marketing Contact	0,25 days	Tue 05/12/06	1 hr	Tue 05/12/06	54			
56	Retail-Top Service & Training Contact	0,25 days	Tue 05/12/06	1 hr	Tue 05/12/06	55			
57	Retail-Shop Food & Services Contact	0,25 days	Wed 06/12/06	1 hr	Wed 06/12/06	56			
58	Retail-Customer Service Contact	0,25 days	Wed 06/12/06	1 hr	Wed 06/12/06	57			
59	Retail-Power Points Contact	0,25 days	Wed 06/12/06	1 hr	Wed 06/12/06	58			
60	Cards Contact	0,5 days	Wed 06/12/06	1 hr	Thu 07/12/06	59			
61	Dealerpanel Contact	0,5 days	Thu 07/12/06	1 hr	Thu 07/12/06	60			
62	Acts Module	1 day	Thu 07/12/06	16 hrs	Thu 07/12/06				
63	Testing Plan	0,5 days	Fri 08/12/06	8 hrs	Fri 08/12/06	23			

Proyecto: Proyecto CRM - Corpor Fecha: Tue 24/10/06	Tarea		Hito		Tareas externas	
	División		Resumen		Hito externo	
	Progreso		Resumen del proyecto		Fecha límite	
Página 2						

ID	Nombre de tarea	Duration	Start	Work	Finish	Pred	Fri 04 Au	Sun 06 A	Tue 08 A
64	Testing Plan Elaboration	0,24 days	Fri 08/12/06	4 hrs	Fri 08/12/06	23			
65	Testing Plan revision with Total Work Team	0,5 days	Fri 08/12/06	2 hrs	Fri 08/12/06				
66	Recommended Adjustments to the Testing Plan	0,25 days	Fri 08/12/06	2 hrs	Fri 08/12/06				
67	Revised Testing Plan	0,5 days	Fri 08/12/06	0 hrs	Fri 08/12/06				
68	Certification Testing	1 day	Fri 08/12/06	28 hrs	Mon 11/12/06	63			
69	Testing Preparation	0,25 days	Fri 08/12/06	4 hrs	Fri 08/12/06				
70	Functionalities Testing	1 day	Fri 08/12/06	8 hrs	Mon 11/12/06				
71	Recommended Adjustments	0,67 days	Fri 08/12/06	16 hrs	Mon 11/12/06				
72	Certified Testing	1 day	Fri 08/12/06	0,8 hrs	Fri 08/12/06				
73	Documentation	22,29 days	Wed 08/11/06	20 hrs	Fri 08/12/06				
74	Technical documentation consolidation and structuring	1 day	Wed 08/11/06	16 hrs	Wed 08/11/06	21			
75	Documentation Adjustements	0,29 days	Fri 08/12/06	4 hrs	Fri 08/12/06	23			
76	Change Management	0 days?	Mon 23/10/06	0 hrs	Mon 23/10/06				
77	Project Management	0 days?	Mon 23/10/06	0 hrs	Mon 23/10/06				
78	Planification	0 days?	Mon 23/10/06	0 hrs	Mon 23/10/06				
79	Project Closure	0,25 days	Mon 11/12/06	4 hrs	Mon 11/12/06	68			
80	Project Closure Presentation Elaboration	0,25 days	Mon 11/12/06	2 hrs	Mon 11/12/06				
81	Project Closure Meeting	0,25 days	Mon 11/12/06	2 hrs	Mon 11/12/06				




Proyecto: Proyecto CRM - Corpor Fecha: Tue 24/10/06	Tarea		Hito		Tareas externas	
	División		Resumen		Hito externo	
	Progreso		Resumen del proyecto		Fecha límite	

Thu 10 A	Sat 12 A	Mon 14 A	Wed 16	Fri 18 Au	Sun 20 A	Tue 22 A	Thu 24 A	Sat 26 A	Mon 28 A	Wed 30	Fri 01 Se	Sun 03 S	Tue 05 S	Thu 07 S	Sat 09 S	Mon 11 S	Wed 13	Fri 15 Se



Proyecto: Proyecto CRM - Corpor Fecha: Tue 24/10/06	Tarea		Hito		Tareas externas	
	División		Resumen		Hito externo	
	Progreso		Resumen del proyecto		Fecha límite	

Thu 10 A	Sat 12 A	Mon 14 A	Wed 16	Fri 18 Au	Sun 20 A	Tue 22 A	Thu 24 A	Sat 26 A	Mon 28 A	Wed 30	Fri 01 Se	Sun 03 S	Tue 05 S	Thu 07 S	Sat 09 S	Mon 11 S	Wed 13	Fri 15 Se

Proyecto: Proyecto CRM - Corpor
 Fecha: Tue 24/10/06










Tarea 
 División 
 Progreso 


Hito 
 Resumen 
 Resumen del proyecto 

Tareas externas 
 Hito externo 
 Fecha límite 








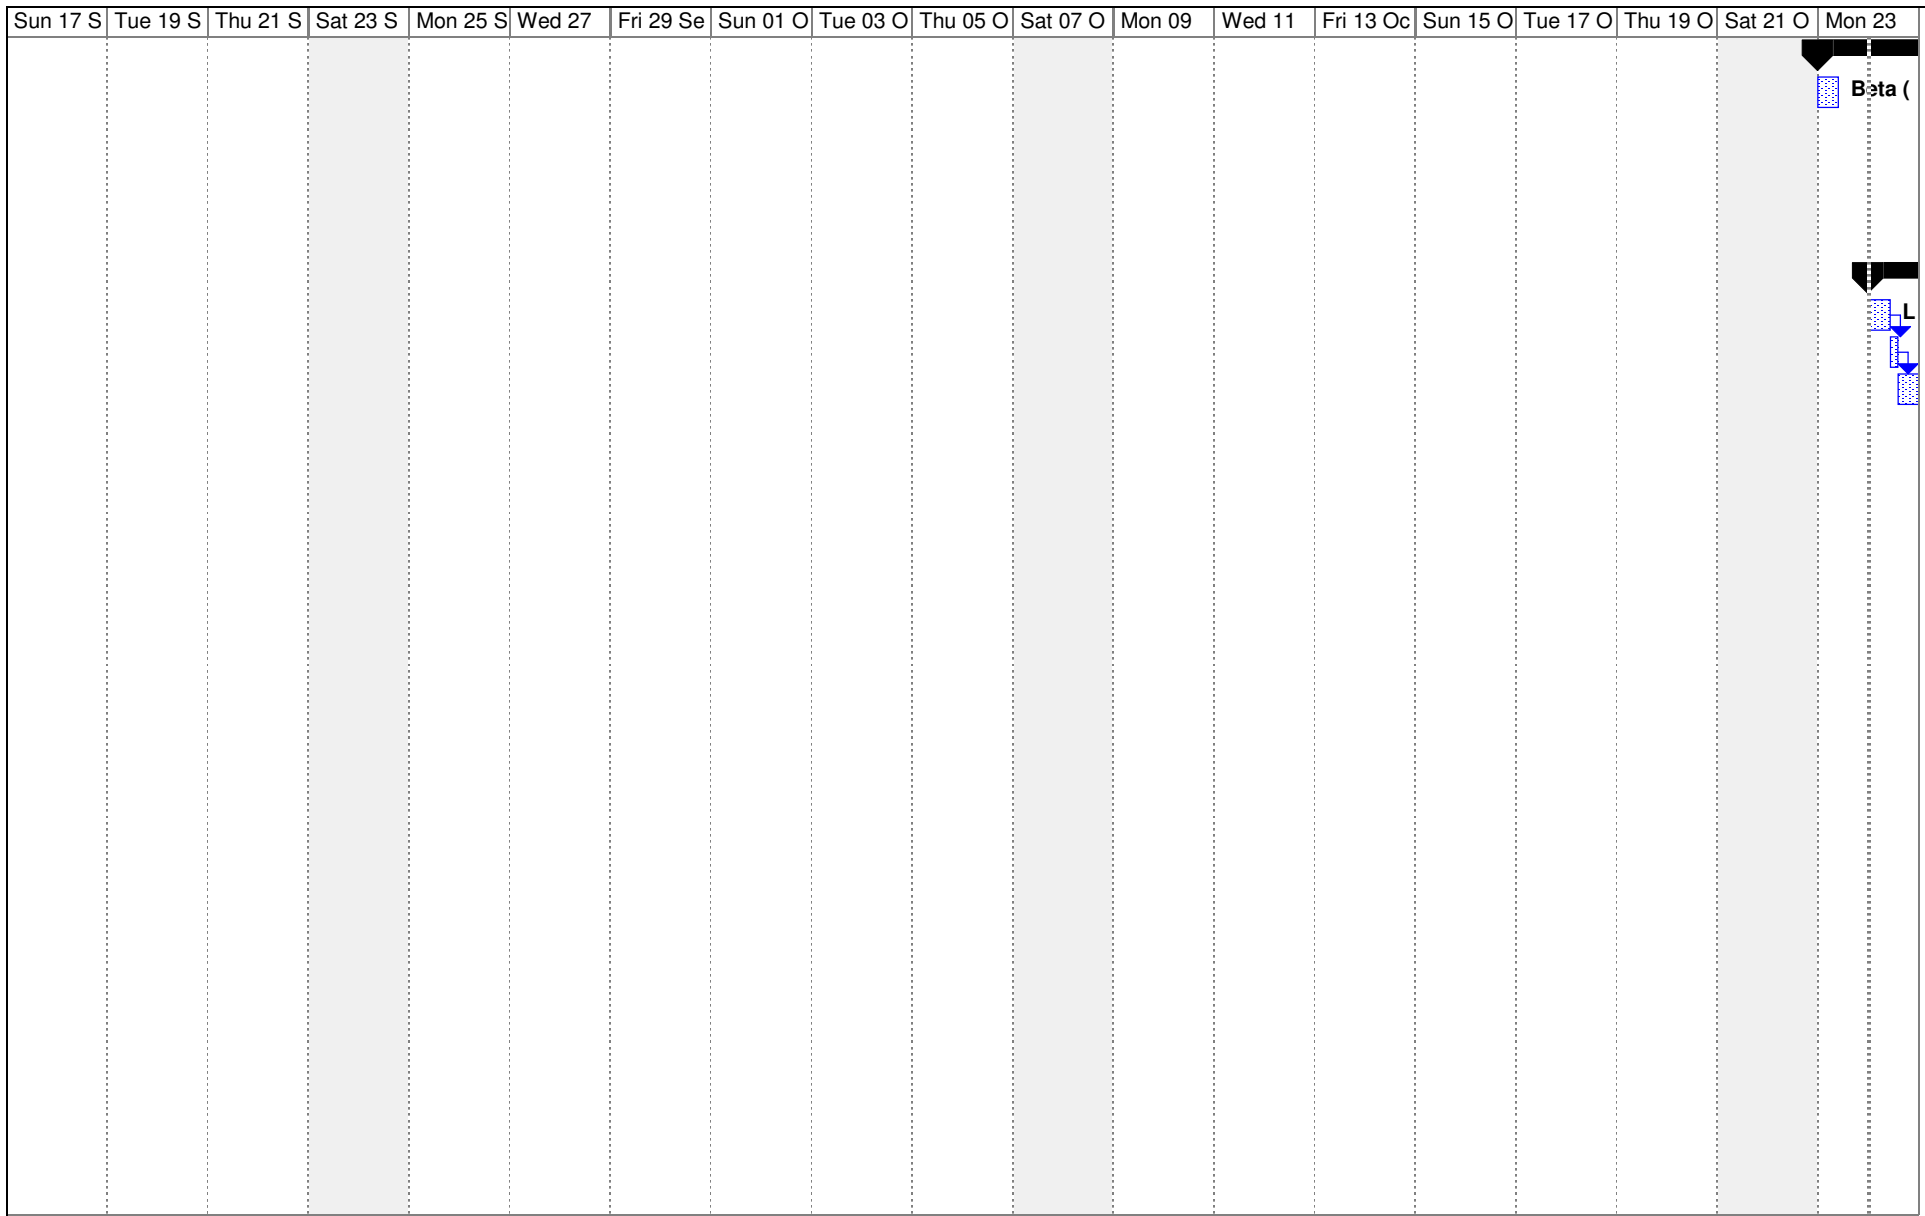

Thu 10 A	Sat 12 A	Mon 14 A	Wed 16	Fri 18 Au	Sun 20 A	Tue 22 A	Thu 24 A	Sat 26 A	Mon 28 A	Wed 30	Fri 01 Se	Sun 03 S	Tue 05 S	Thu 07 S	Sat 09 S	Mon 11 S	Wed 13	Fri 15 Se

--










Proyecto: Proyecto CRM - Corpor Fecha: Tue 24/10/06	Tarea		Hito		Tareas externas	
	División		Resumen		Hito externo	
	Progreso		Resumen del proyecto		Fecha límite	




Proyecto: Proyecto CRM - Corpor
 Fecha: Tue 24/10/06

Tarea		Hito		Tareas externas	
División		Resumen		Hito externo	
Progreso		Resumen del proyecto		Fecha límite	


Sun 17 S	Tue 19 S	Thu 21 S	Sat 23 S	Mon 25 S	Wed 27	Fri 29 Se	Sun 01 O	Tue 03 O	Thu 05 O	Sat 07 O	Mon 09	Wed 11	Fri 13 Oc	Sun 15 O	Tue 17 O	Thu 19 O	Sat 21 O	Mon 23

Proyecto: Proyecto CRM - Corpor Fecha: Tue 24/10/06	Tarea		Hito		Tareas externas	
	División		Resumen		Hito externo	
	Progreso		Resumen del proyecto		Fecha límite	

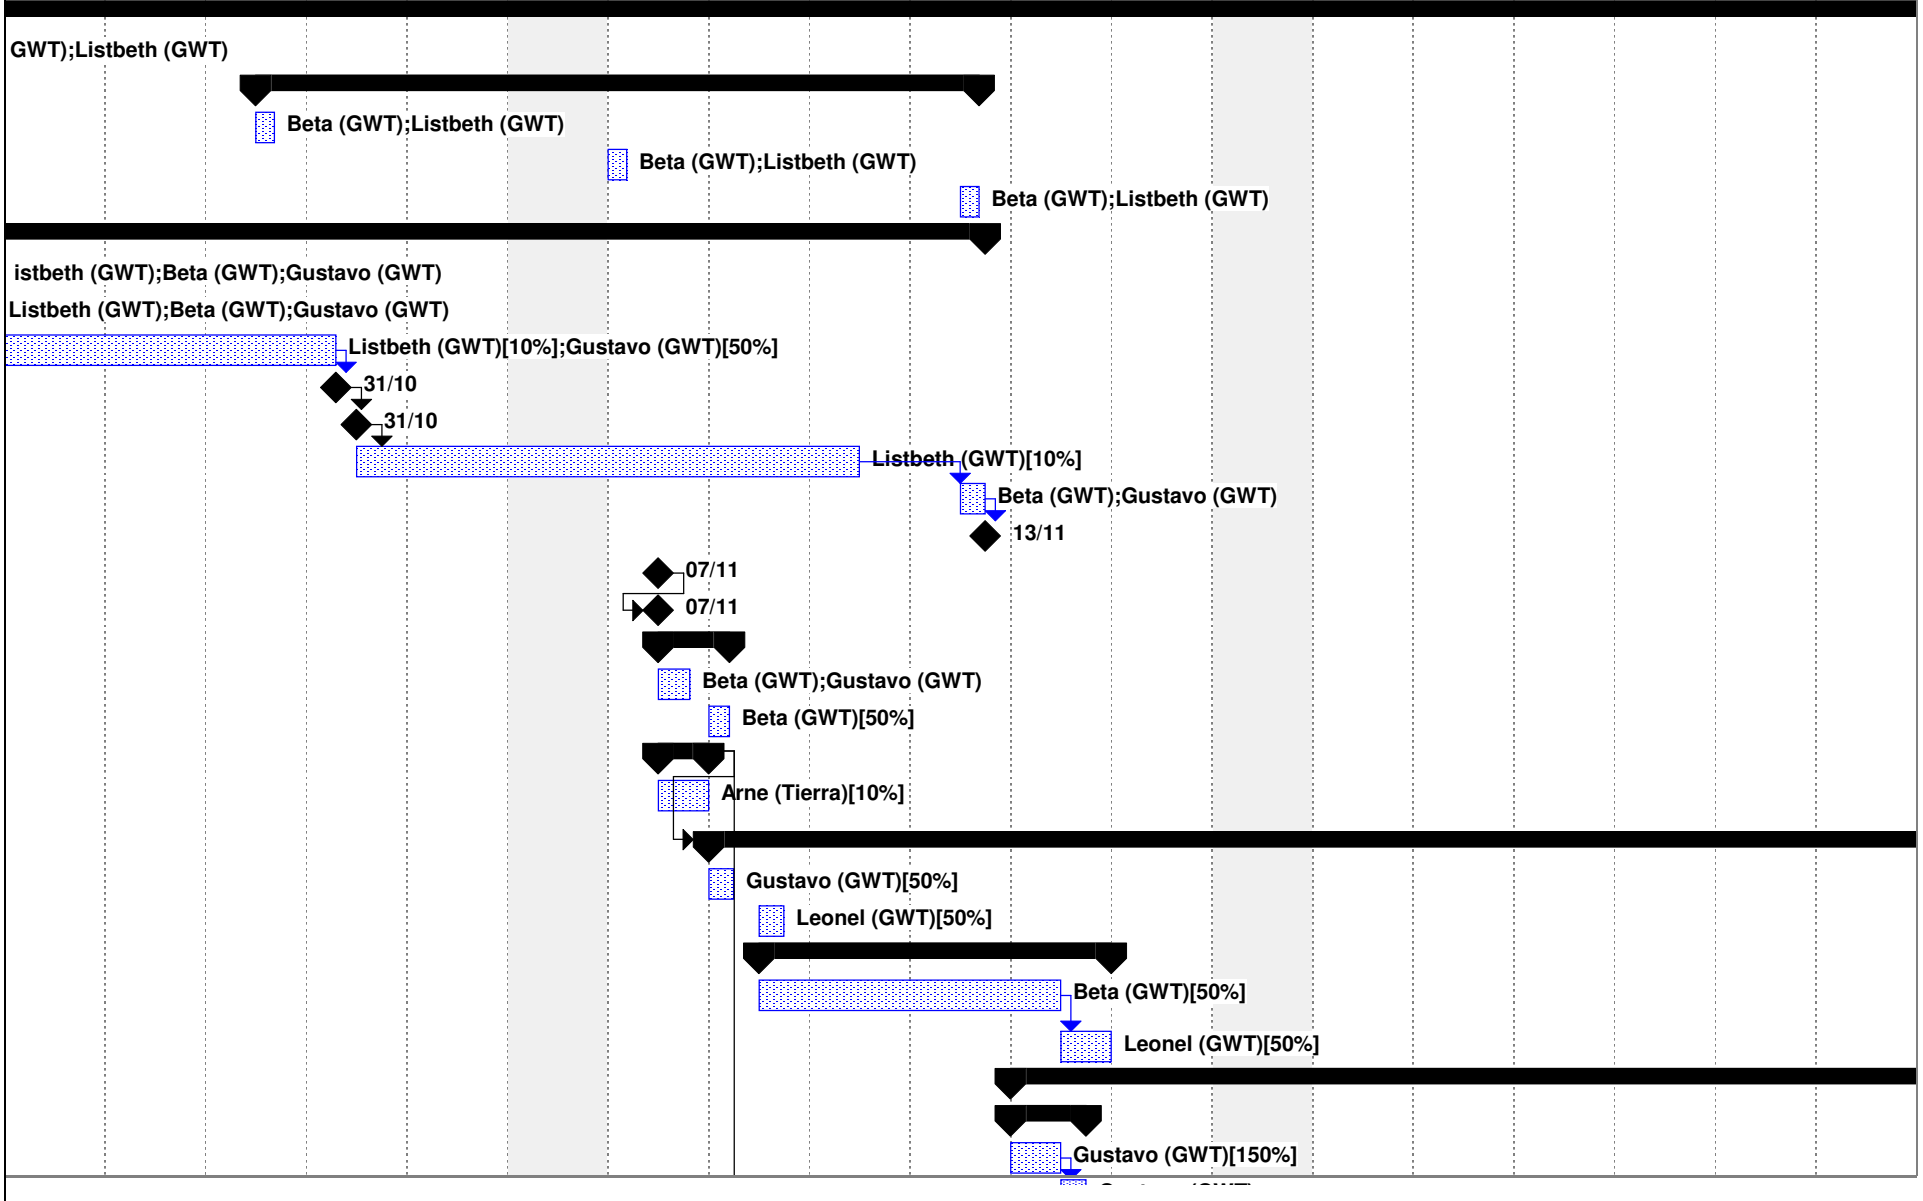









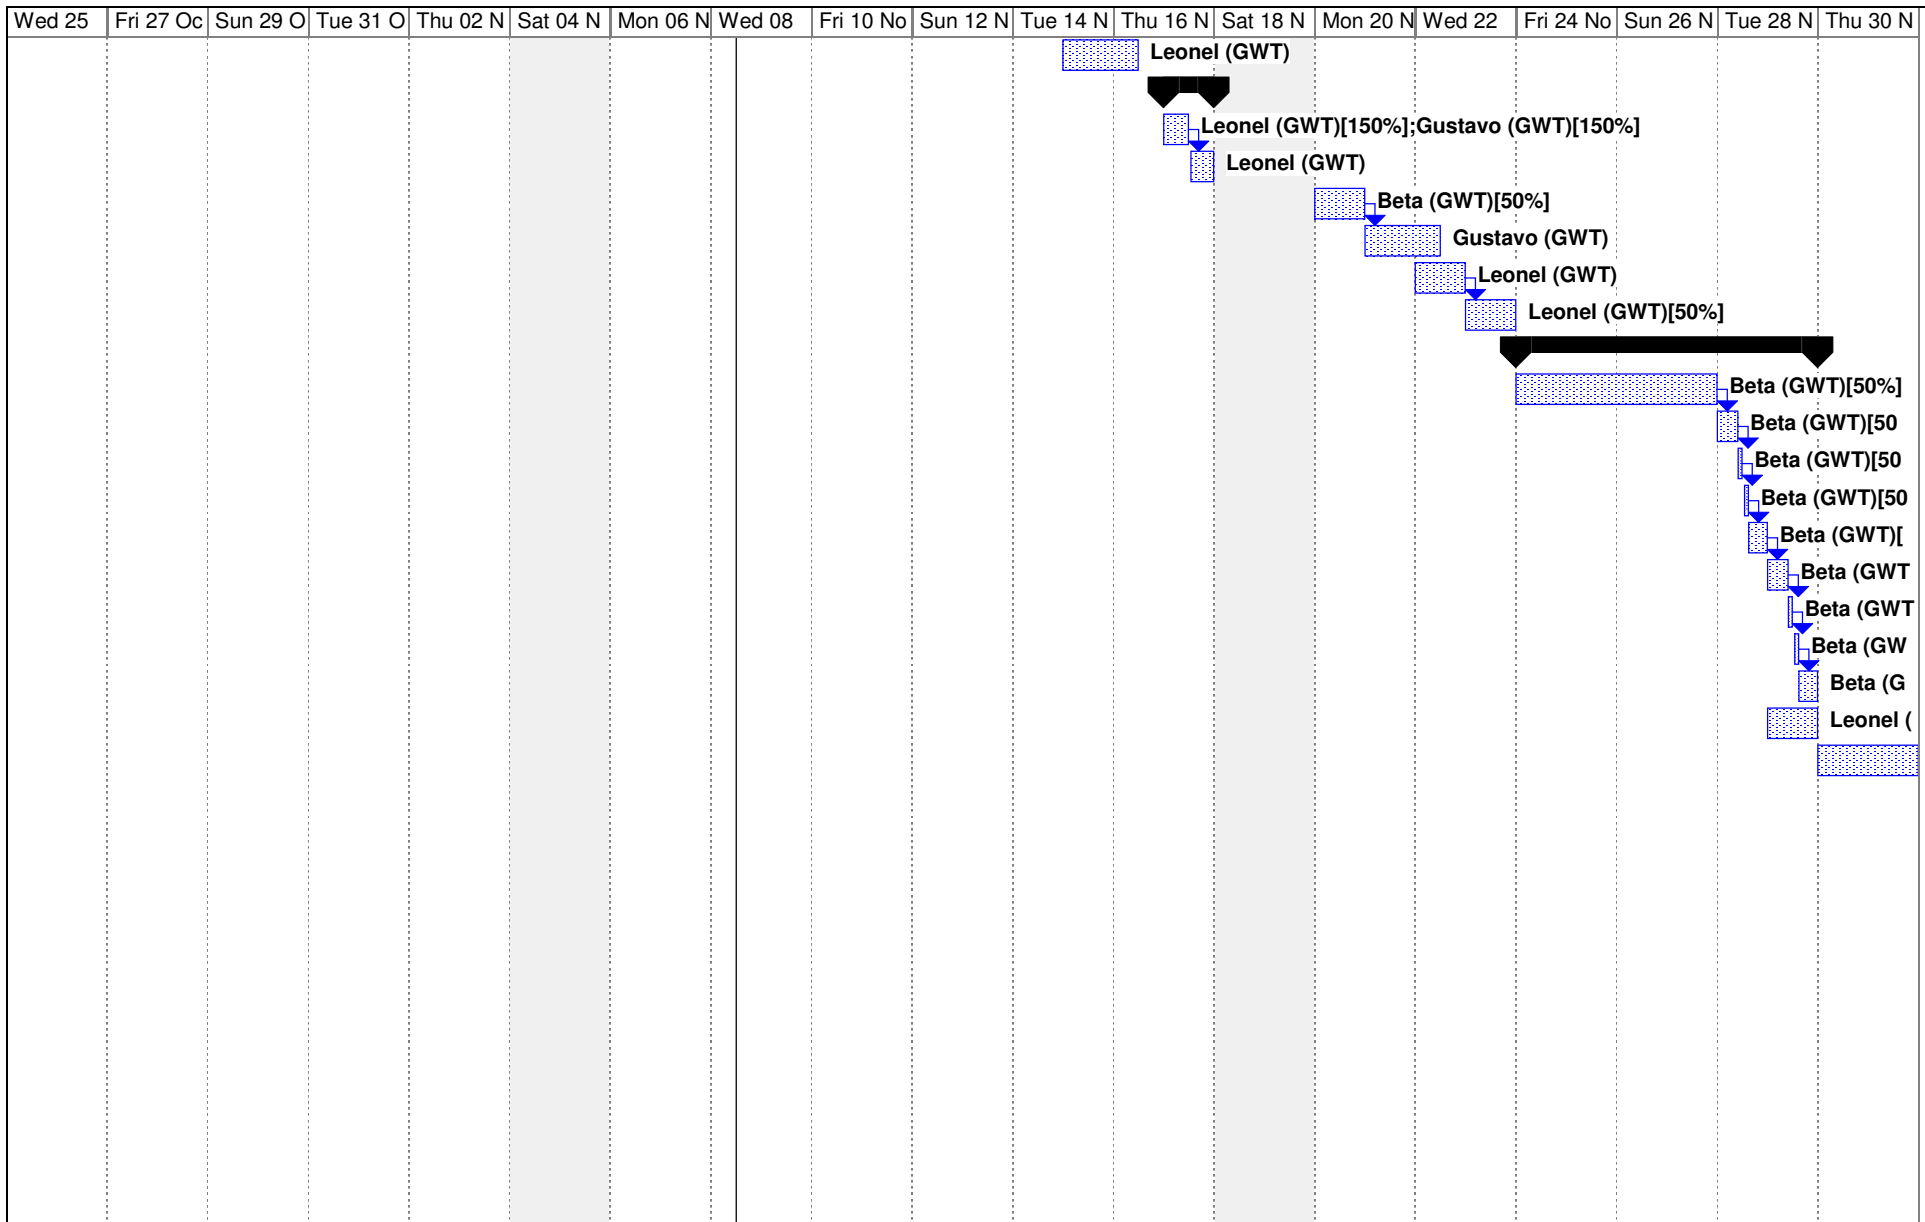

Proyecto: Proyecto CRM - Corpor
 Fecha: Tue 24/10/06

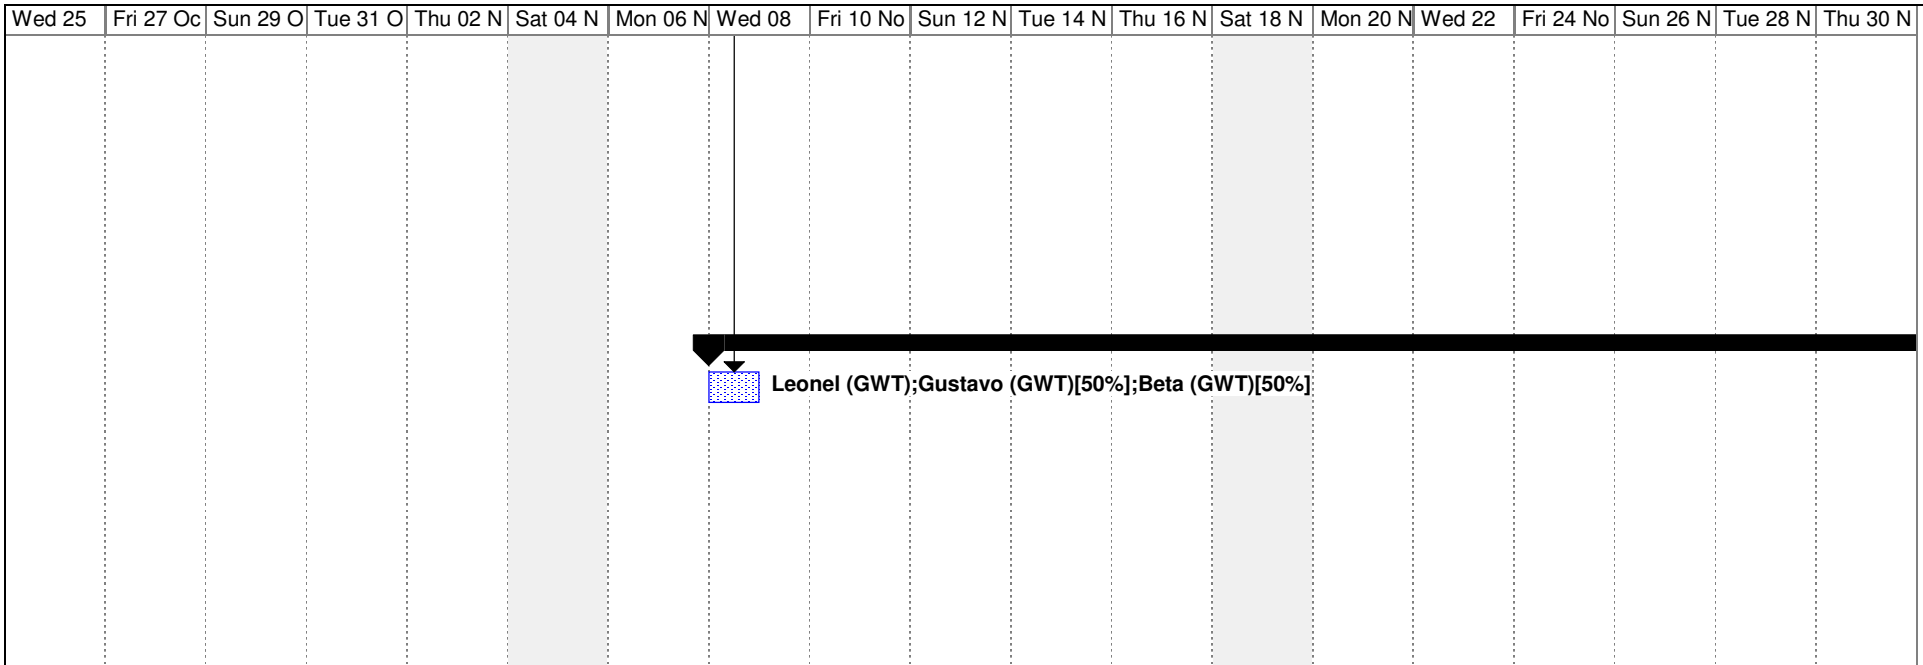
Tarea		Hito		Tareas externas	
División		Resumen		Hito externo	
Progreso		Resumen del proyecto		Fecha límite	




Proyecto: Proyecto CRM - Corpor Fecha: Tue 24/10/06	Tarea		Hito		Tareas externas	
	División		Resumen		Hito externo	
	Progreso		Resumen del proyecto		Fecha límite	



Proyecto: Proyecto CRM - Corpor Fecha: Tue 24/10/06	Tarea		Hito		Tareas externas	
	División		Resumen		Hito externo	
	Progreso		Resumen del proyecto		Fecha límite	

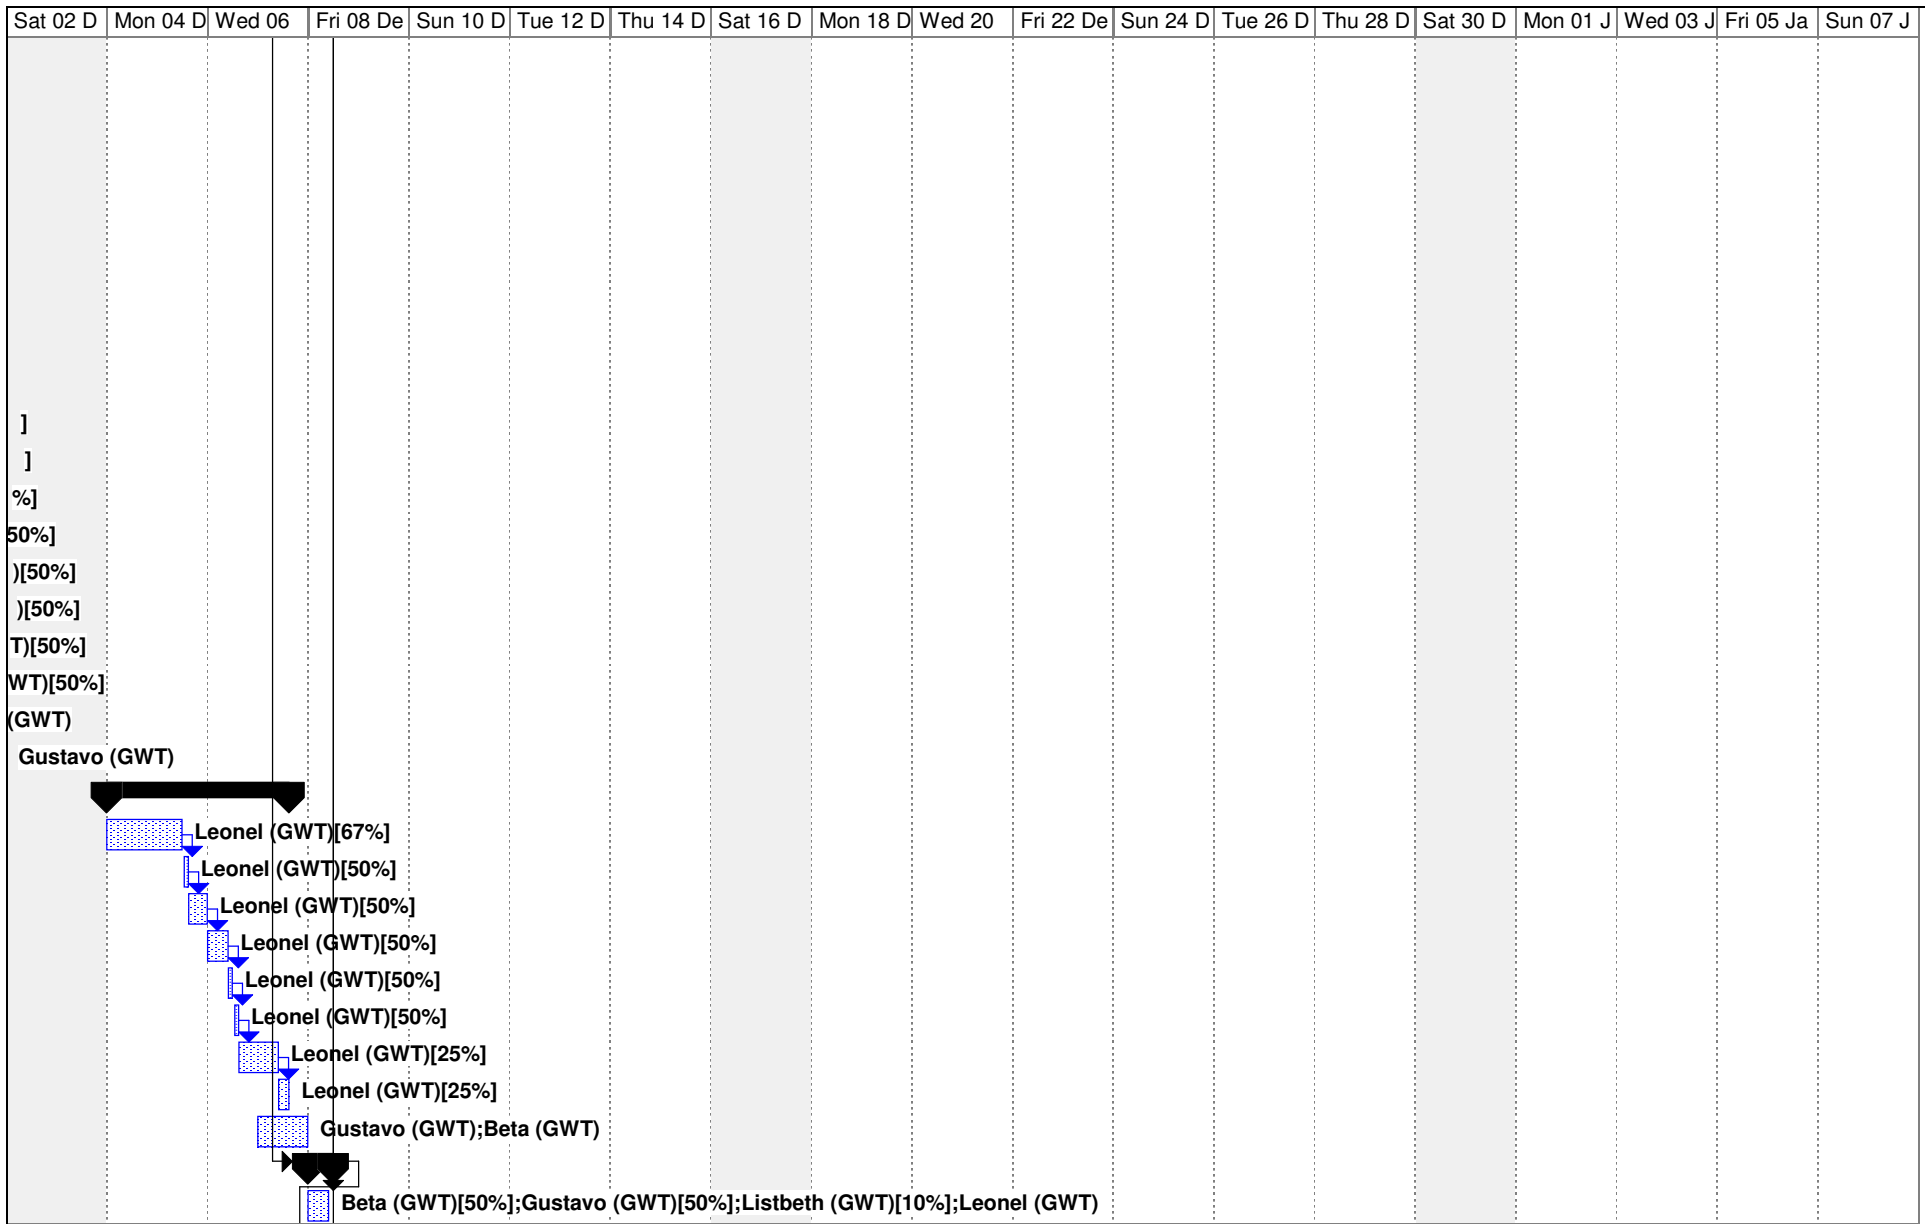

Proyecto: Proyecto CRM - Corpor Fecha: Tue 24/10/06	Tarea		Hito		Tareas externas	
	División		Resumen		Hito externo	
	Progreso		Resumen del proyecto		Fecha límite	

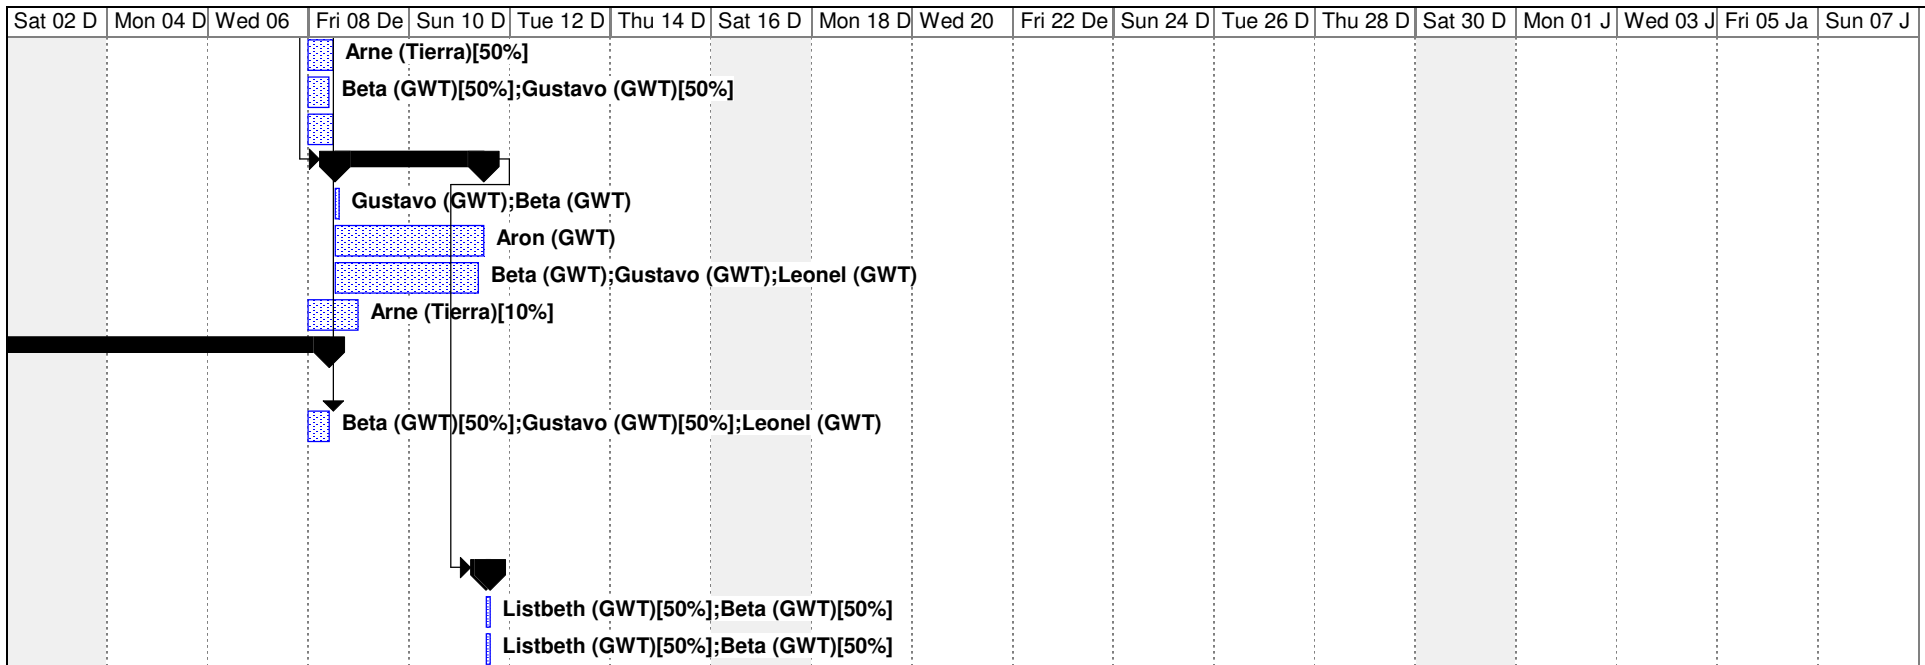

Proyecto: Proyecto CRM - Corpor Fecha: Tue 24/10/06	Tarea		Hito		Tareas externas	
	División		Resumen		Hito externo	
	Progreso		Resumen del proyecto		Fecha límite	
