


Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Trabajo	% completado	abri
1	<b>Cines Unidos</b>	<b>205,5 días</b>	<b>jue 03/05/07</b>	<b>vie 22/02/08</b>	<b>5.146,4 horas</b>	<b>39%</b>	
2	Reunión de Arranque (Kickoff)	0,25 días	jue 03/05/07	jue 03/05/07	8 horas	100%	
3	<b>Etapa I - Preparandonos para la Independencia</b>	<b>101,1 días</b>	<b>vie 04/05/07</b>	<b>mié 26/09/07</b>	<b>2.670,4 horas</b>	<b>63%</b>	
4	<b>Fase I - Levantamiento de Información</b>	<b>30 días</b>	<b>vie 04/05/07</b>	<b>vie 15/06/07</b>	<b>450 horas</b>	<b>100%</b>	
5	Levantamiento Info (Visita al Cine)	0,5 días	vie 04/05/07	vie 04/05/07	24 horas	100%	
6	Inducción Cines Unidos	2 días	mié 09/05/07	vie 11/05/07	24 horas	100%	
7	Presentación N2C y CRM	0,38 días	mié 09/05/07	mié 09/05/07	9 horas	100%	
8	<b>Modelo de Procesos</b>	<b>7,5 días</b>	<b>lun 14/05/07</b>	<b>mié 23/05/07</b>	<b>64 horas</b>	<b>100%</b>	
9	Preparación para Mesas de Trabajo	0,25 días	lun 14/05/07	lun 14/05/07	8 horas	100%	
10	Mesa de Trabajo # 1	0,5 días	mar 15/05/07	mar 15/05/07	16 horas	100%	
11	Mesa de Trabajo # 2	0,5 días	jue 17/05/07	jue 17/05/07	16 horas	100%	
12	Mesa de Trabajo # 3	0,5 días	mié 23/05/07	mié 23/05/07	16 horas	100%	
13	Documentación Modelo de Procesos	4 días	jue 17/05/07	mar 22/05/07	8 horas	100%	
14	<b>Modelo de Datos</b>	<b>10 días</b>	<b>mar 22/05/07</b>	<b>lun 04/06/07</b>	<b>72 horas</b>	<b>100%</b>	
15	Análisis Modelo de Datos Actual	0,25 días	mar 22/05/07	mar 22/05/07	8 horas	100%	
16	Elaboración Modelo de Datos Preliminar	1 día	jue 24/05/07	vie 25/05/07	16 horas	100%	
17	Mesa de Trabajo - Kernel	0,5 días	mié 30/05/07	mié 30/05/07	24 horas	100%	
18	Mesa de Trabajo # 4 (Sist CU - GWT)	0,5 días	jue 31/05/07	jue 31/05/07	16 horas	100%	
19	Ajustes al Modelo	2 días	vie 01/06/07	lun 04/06/07	8 horas	100%	
20	<b>Configuración Ambiente de Desarrollo</b>	<b>10 días</b>	<b>mar 29/05/07</b>	<b>mar 12/06/07</b>	<b>152 horas</b>	<b>100%</b>	
21	Análisis Req. Adiestramiento configuración e instalación de Vista y MegaSoft	2 días	mar 29/05/07	mié 30/05/07	64 horas	100%	
22	Instalación y configuración de ambiente a imagen y semejanza de ambiente de producción de Cines Unidos	6 días	lun 04/06/07	mar 12/06/07	72 horas	100%	
23	Configuración de VPN para acceso remoto	5,33 días	lun 04/06/07	lun 11/06/07	16 horas	100%	
24	<b>Infraestructura a Futuro</b>	<b>20 días</b>	<b>lun 14/05/07</b>	<b>vie 08/06/07</b>	<b>77 horas</b>	<b>100%</b>	
25	<b>Investigación de requerimientos de infraestructura</b>	<b>15 días</b>	<b>lun 14/05/07</b>	<b>vie 01/06/07</b>	<b>60 horas</b>	<b>100%</b>	
26	<b>Elaborar informe</b>	<b>5 días</b>	<b>lun 04/06/07</b>	<b>vie 08/06/07</b>	<b>17 horas</b>	<b>100%</b>	
27	<b>Informe de Especificación de Requerimientos</b>	<b>10,5 días</b>	<b>jue 31/05/07</b>	<b>vie 15/06/07</b>	<b>28 horas</b>	<b>100%</b>	
28	Elaboración del Informe de Especificación de Requerimientos	3 días	jue 31/05/07	mar 05/06/07	20 horas	100%	
29	Entrega al Equipo de Proyecto CU para su revisión	0 días	mar 05/06/07	mar 05/06/07	0 horas	100%	
30	Revisión por parte del Equipo de Proyecto CU	2 días	mié 06/06/07	vie 08/06/07	0 horas	100%	
31	Ajustes al Informe Especificación de Requerimientos	2 días	lun 11/06/07	mar 12/06/07	8 horas	100%	
32	Entrega de Especificación de Req. para aprobación	0 días	mar 12/06/07	mar 12/06/07	0 horas	100%	
33	Aprobación del Informe Especificación de Requerimientos	0 días	vie 15/06/07	vie 15/06/07	0 horas	100%	
34	<b>Informe Especificación de Requerimientos Aprobado</b>	<b>0 días</b>	<b>vie 15/06/07</b>	<b>vie 15/06/07</b>	<b>0 horas</b>	<b>100%</b>	
35	<b>Modelo de Procesos Definido</b>	<b>0 días</b>	<b>vie 15/06/07</b>	<b>vie 15/06/07</b>	<b>0 horas</b>	<b>100%</b>	
36	<b>Modelo de Datos Definido</b>	<b>0 días</b>	<b>vie 15/06/07</b>	<b>vie 15/06/07</b>	<b>0 horas</b>	<b>100%</b>	

Proyecto: Planning Cines Unidos  
Fecha: lun 27/08/07


Tarea 

Hito 


Tareas externas 

División 

Resumen 

Hito exteTarea 

Progreso 

Resumen del proyecto 

División 

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Trabajo	%		
							completado	abri
37	<b>Informe Infraestructura y Crecimiento Futuro</b>	0 días	vie 15/06/07	vie 15/06/07	0 horas	100%		
38	<b>Fase II - Conformación de las bases</b>	38,5 días	mié 06/06/07	mié 01/08/07	546,4 horas	95%		
39	<b>Directorio de Clientes y CRM</b>	13 días	mié 06/06/07	vie 22/06/07	250,4 horas	89%		
40	Análisis de Base de Datos de Clientes y Transacciones del proveedor actual (BD)	0,5 días	mié 06/06/07	mié 06/06/07	20 horas	100%		
41	Equivalencia entre la base de datos del Proveedor Actual vs. lo levantado	0,5 días	jue 07/06/07	jue 07/06/07	20 horas	100%		
42	Crear en N2C la nueva estructura de la B.D de Clientes	1 día	jue 07/06/07	vie 08/06/07	18,4 horas	100%		
43	Configuración Directorio de Clientes	4 días	vie 08/06/07	jue 14/06/07	32 horas	100%		
44	Carga inicial de datos de Clientes y Transacciones en N2C	3 días	jue 14/06/07	mar 19/06/07	40 horas	20%		
45	Implementar mecanismo de carga diaria de datos provenientes del Proveedor Actual a Cines Unidos	1 día	mar 19/06/07	mié 20/06/07	16 horas	100%		
46	Implementar facilidad de monitoreo quincenal de los datos para su depuración	1 día	mié 20/06/07	jue 21/06/07	24 horas	100%		
47	Envío de correos masivos con políticas de colas y administración de mensajes devueltos	4 días	vie 15/06/07	mié 20/06/07	32 horas	100%		
48	<b>Reportes de Clientes</b>	7 días	jue 14/06/07	vie 22/06/07	48 horas	100%		
49	Implementación de 10 reportes básicos	4 días	jue 14/06/07	mar 19/06/07	24 horas	100%		
50	Implementación de 3 reportes estadísticos	3 días	mié 20/06/07	vie 22/06/07	24 horas	100%		
51	<b>CRM</b>	16 días	lun 25/06/07	mar 17/07/07	160 horas	100%		
52	<b>Implantación</b>	9,5 días	mié 18/07/07	mié 01/08/07	136 horas	100%		
53	Pruebas internas	2 días	mié 18/07/07	jue 19/07/07	32 horas	100%		
54	Ajustes recomendados	2 días	vie 20/07/07	lun 23/07/07	16 horas	100%		
55	Documentación	5 días	mié 18/07/07	mié 25/07/07	40 horas	100%		
56	Adiestramiento	1,5 días	jue 26/07/07	vie 27/07/07	24 horas	100%		
57	Pruebas de Certificación	3 días	vie 27/07/07	mié 01/08/07	24 horas	100%		
58	<b>Directorios de Clientes implantado</b>	0 días	mié 01/08/07	mié 01/08/07	0 horas	100%		
59	<b>Reportes y Estadísticas de Clientes implantado</b>	0 días	mié 01/08/07	mié 01/08/07	0 horas	100%		
60	<b>CRM implantado</b>	0 días	mié 01/08/07	mié 01/08/07	0 horas	100%		
61	Adiestramiento Asterisk	3 días	lun 18/06/07	jue 21/06/07	0 horas	100%		
62	<b>Fase III - Integración</b>	62,1 días	jue 21/06/07	mié 19/09/07	1.490 horas	35%		
63	Vista	40 días	jue 21/06/07	vie 17/08/07	650 horas	60%		
64	MegaSoft	24 días	mié 01/08/07	mar 04/09/07	480 horas	45%		
65	Pagina Web	15,5 días	mié 01/08/07	lun 10/09/07	200 horas	20%		
66	<b>Implantación</b>	22,1 días	lun 20/08/07	mié 19/09/07	160 horas	8%		
67	Pruebas internas	15 días	lun 20/08/07	vie 07/09/07	16 horas	20%		
68	Ajustes recomendados	2 días	lun 10/09/07	mar 11/09/07	40 horas	0%		
69	Documentación	15 días	lun 20/08/07	vie 07/09/07	40 horas	0%		
70	Adiestramiento	1,1 días	jue 13/09/07	vie 14/09/07	24 horas	0%		

Proyecto: Planning Cines Unidos  
Fecha: lun 27/08/07


Tarea 

Hito 

Tareas externas 

División 

Resumen 










Hito exteTarea 


Progreso 

Resumen del proyecto 


División 

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Trabajo	%	
						completado	abri
71	Pruebas de Certificación	3 días	vie 14/09/07	mié 19/09/07	40 horas	0%	
72	<i>N2C y Vista Integrados</i>	<i>0 días</i>	<i>mié 19/09/07</i>	<i>mié 19/09/07</i>	0 horas	0%	
73	<i>N2C y Merchant integrados</i>	<i>0 días</i>	<i>mié 19/09/07</i>	<i>mié 19/09/07</i>	0 horas	0%	
74	<i>N2C y Página web integrados</i>	<i>0 días</i>	<i>mié 19/09/07</i>	<i>mié 19/09/07</i>	0 horas	0%	
75	<b>Fase IV - Independencia</b>	<b>8 días</b>	<b>vie 14/09/07</b>	<b>mié 26/09/07</b>	<b>184 horas</b>	<b>0%</b>	
76	Pruebas Independencia	5 días	vie 14/09/07	vie 21/09/07	160 horas	0%	
77	Independizarse del proveedor actual	3 días	vie 21/09/07	mié 26/09/07	24 horas	0%	
78	<i>Cines Unidos independizado de Proveedor Actual</i>	<i>0 días</i>	<i>mié 26/09/07</i>	<i>mié 26/09/07</i>	<i>0 horas</i>	0%	
79	<b>Etapas II - Hacia al e_Business</b>	<b>56,38 días</b>	<b>mié 26/09/07</b>	<b>vie 14/12/07</b>	<b>1.042 horas</b>	<b>0%</b>	
80	<b>Cartelera Cinematográfica</b>	12 días	mié 26/09/07	lun 15/10/07	120 horas	0%	
81	<b>Integración Call Center</b>	30 días	mié 26/09/07	jue 08/11/07	200 horas	0%	
82	<b>Integración con Asterisk (**)</b>	<b>13 días</b>	<b>jue 08/11/07</b>	<b>mar 27/11/07</b>	<b>250 horas</b>	<b>0%</b>	
83	<b>Integración Tienda Cines Unidos</b>	24 días	lun 15/10/07	vie 16/11/07	100 horas	0%	
84	<b>Integración Taquilla</b>	15,38 días	jue 08/11/07	jue 29/11/07	200 horas	0%	
85	Pruebas internas	2,5 días	jue 29/11/07	lun 03/12/07	40 horas	0%	
86	Documentación	2,5 días	lun 03/12/07	jue 06/12/07	40 horas	0%	
87	Adiestramiento	2 días	jue 06/12/07	lun 10/12/07	32 horas	0%	
88	Pruebas de Certificación	4 días	lun 10/12/07	vie 14/12/07	60 horas	0%	
89	<i>Cartelera Cinematográfica implantada</i>	<i>0 días</i>	<i>vie 14/12/07</i>	<i>vie 14/12/07</i>	<i>0 horas</i>	0%	
90	<i>Integración Call Center implantado</i>	<i>0 días</i>	<i>vie 14/12/07</i>	<i>vie 14/12/07</i>	<i>0 horas</i>	0%	
91	<i>Integración Tienda Cines Unidos implantado</i>	<i>0 días</i>	<i>vie 14/12/07</i>	<i>vie 14/12/07</i>	<i>0 horas</i>	0%	
92	<b>Etapas III - Inteligencia de Negocio</b>	<b>40 días</b>	<b>vie 14/12/07</b>	<b>mié 13/02/08</b>	<b>548 horas</b>	<b>0%</b>	
93	Integración con InfoWorks	40 días	vie 14/12/07	mié 13/02/08	450 horas	0%	
94	Evaluación tecnológica de Pentaho	10 días	vie 14/12/07	mié 02/01/08	98 horas	0%	
95	<b>Gerencia de Proyectos</b>	<b>205 días</b>	<b>jue 03/05/07</b>	<b>jue 21/02/08</b>	<b>870 horas</b>	<b>40%</b>	
96	<b>Cierre</b>	<b>0,5 días</b>	<b>vie 22/02/08</b>	<b>vie 22/02/08</b>	<b>8 horas</b>	<b>0%</b>	

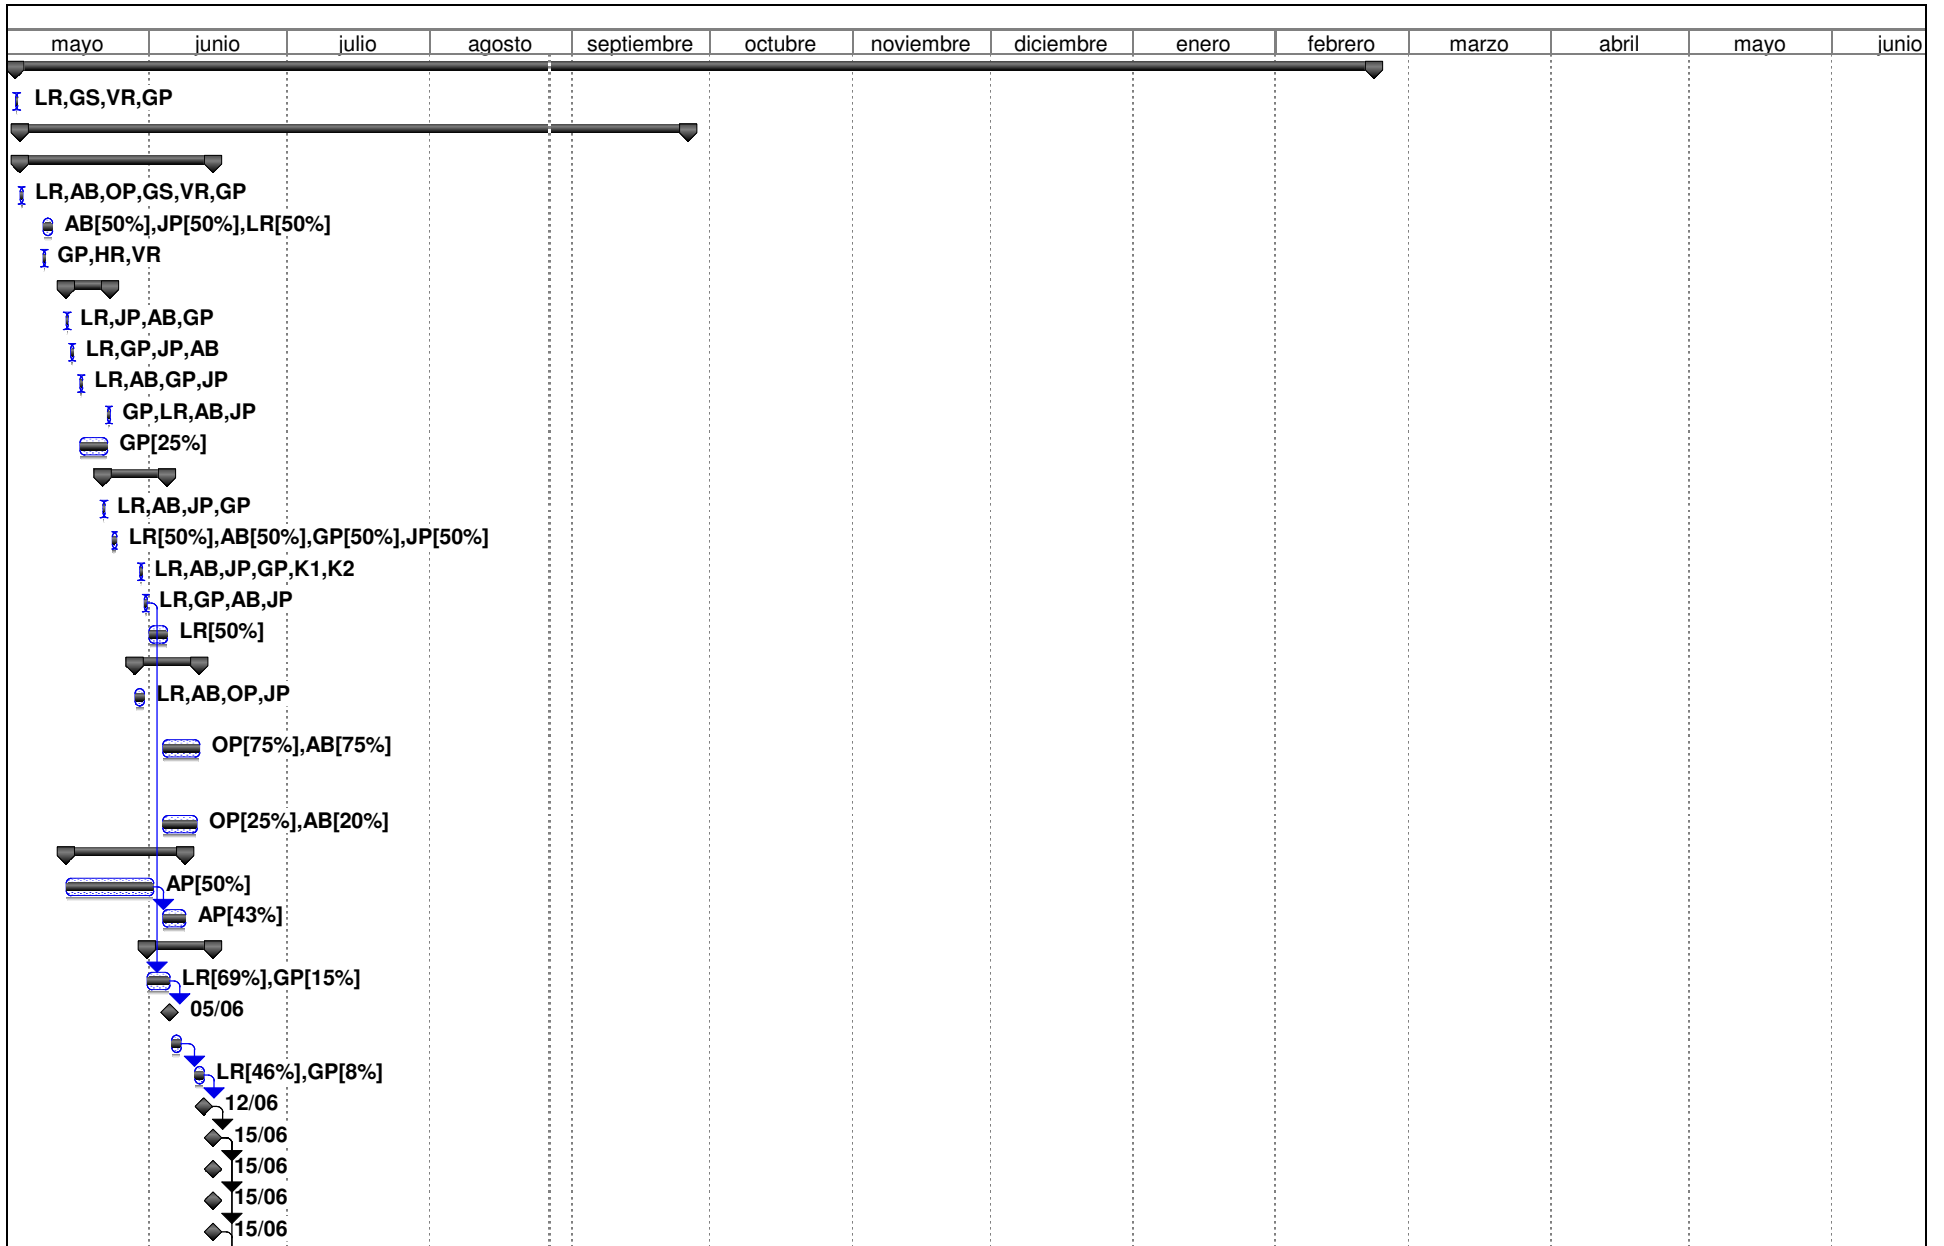


Proyecto: Planning Cines Unidos Fecha: lun 27/08/07	Tarea		Hito		Tareas externas	
	División		Resumen		Hito exteTarea	
	Progreso		Resumen del proyecto		División	



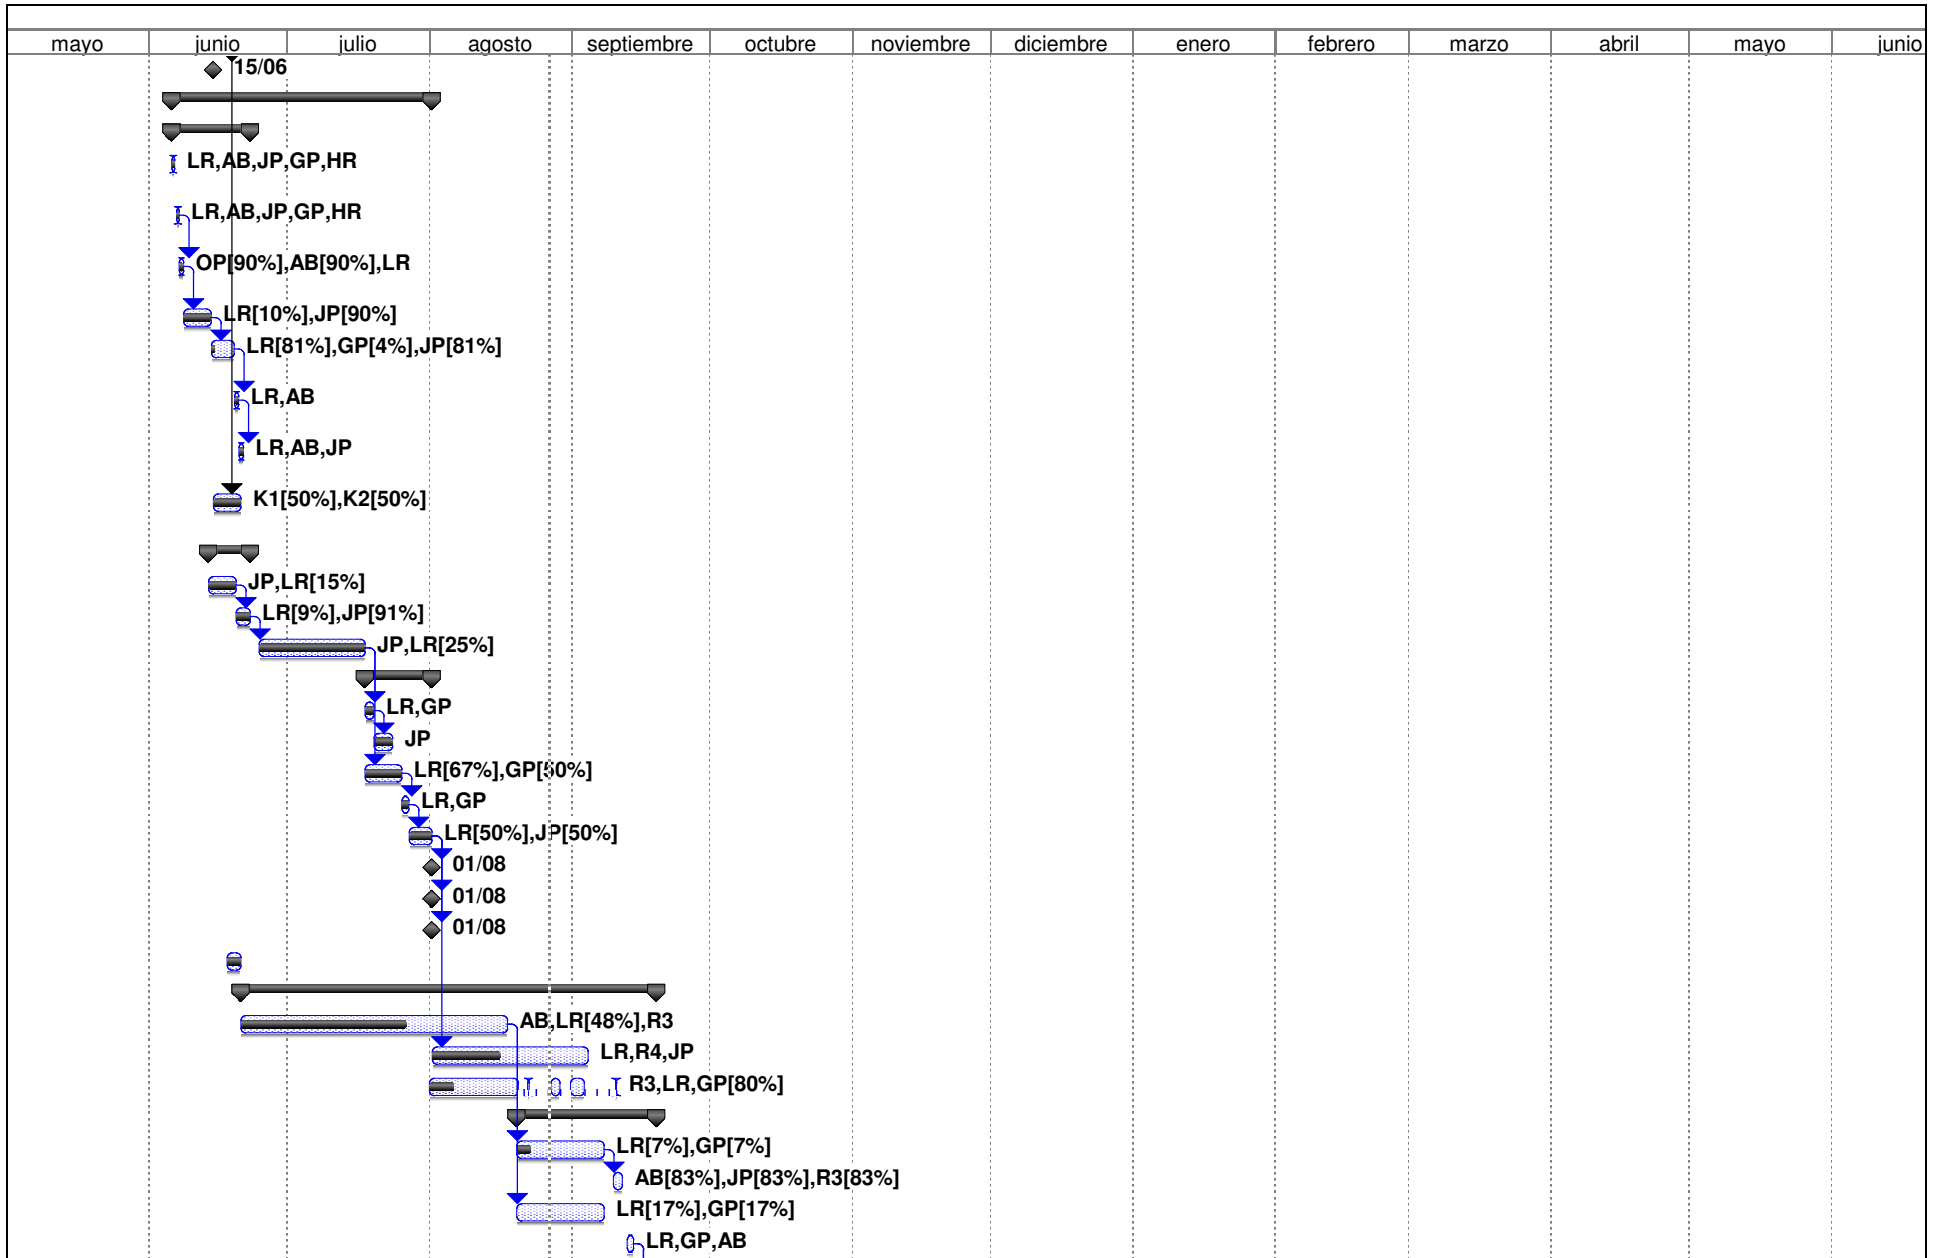


Proyecto: Planning Cines Unidos Fecha: lun 27/08/07	Tarea		Hito		Tareas externas	
	División		Resumen		Hito exteTarea	
	Progreso		Resumen del proyecto		División	




Proyecto: Planning Cines Unidos  
 Fecha: lun 27/08/07

Tarea   
 División   
 Progreso 

Hito   
 Resumen   
 Resumen del proyecto 

Tareas externas   
 Hito exteTarea   
 División 

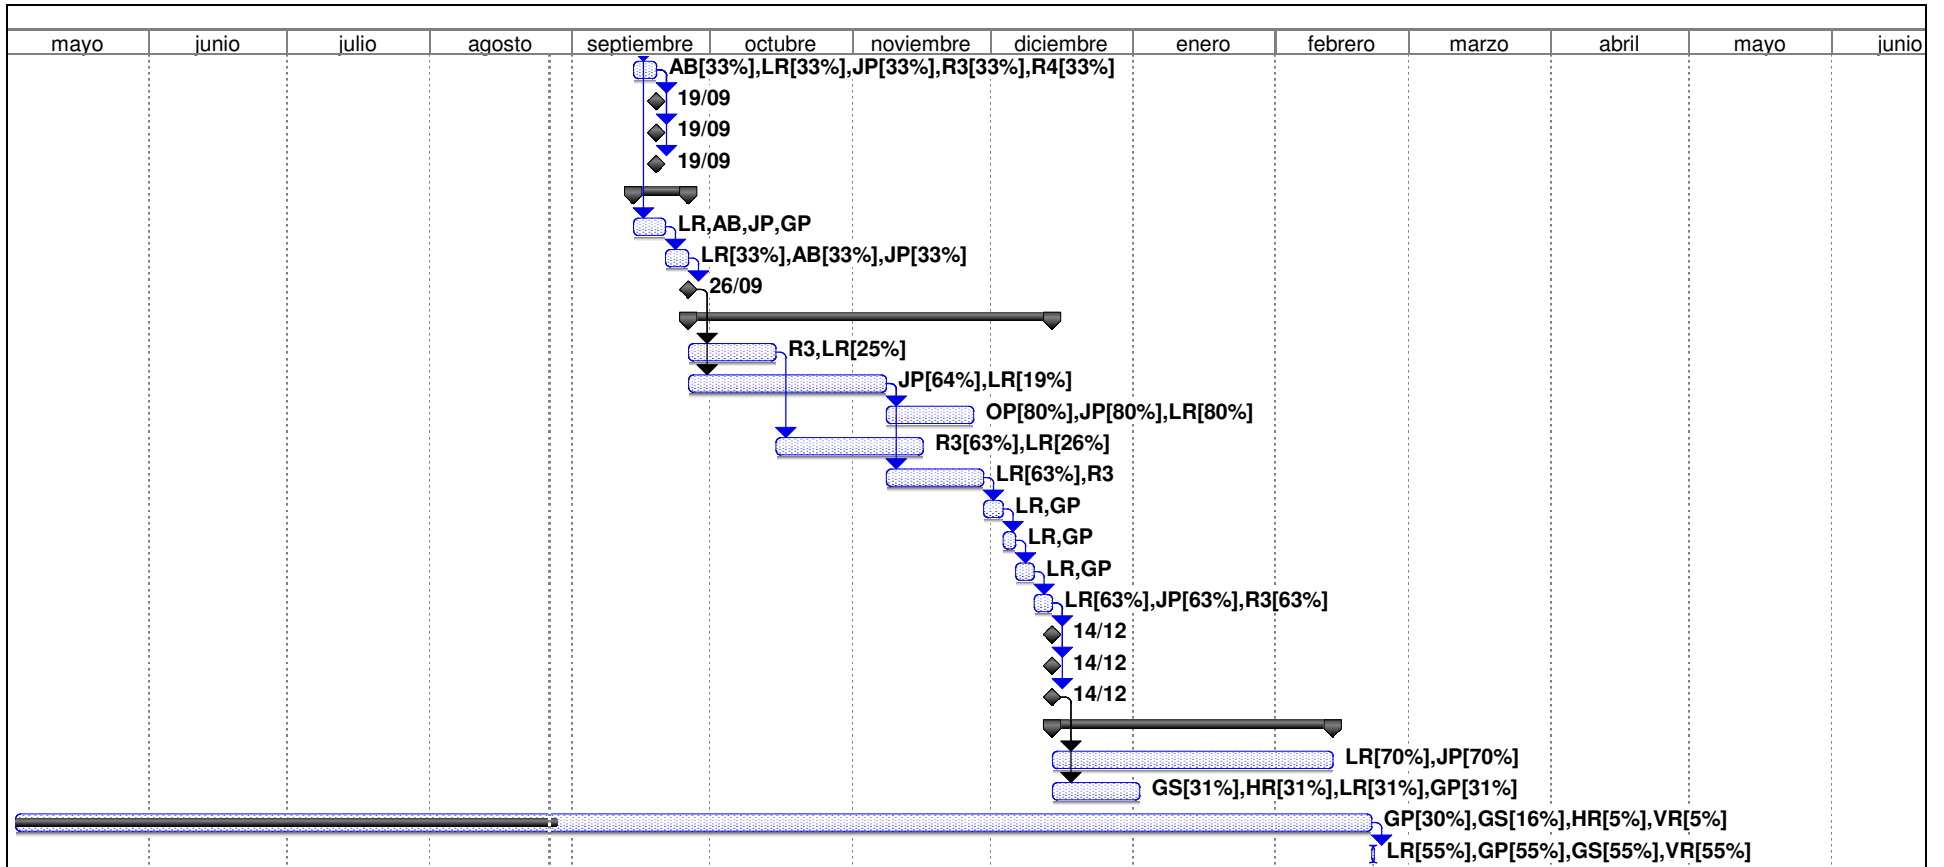

Proyecto: Planning Cines Unidos Fecha: lun 27/08/07	Tarea		Hito		Tareas externas	
	División		Resumen		Hito exteTarea	
	Progreso		Resumen del proyecto		División	
