

¿Qué pasó? (Actividades realizadas desde el último seguimiento):

- Ajustes en Pre-facturación
- Actividades relacionadas con Proforma

¿Qué debería haber pasado?


Culminar Generación de Proforma y Facturación modo Proforma

¿Por qué tenemos una diferencia entre lo que pasó y lo que debería haber pasado? (Incluir Áreas de Atención)

Inversión de tiempo en ajustes de funcionalidades relacionadas con actividades anteriores

¿Qué debemos hacer para mantenernos dentro del Plan? (Próximas Actividades y Responsables)

Acelerar el desarrollo de las actividades atrasadas y hacer pruebas más efectivas

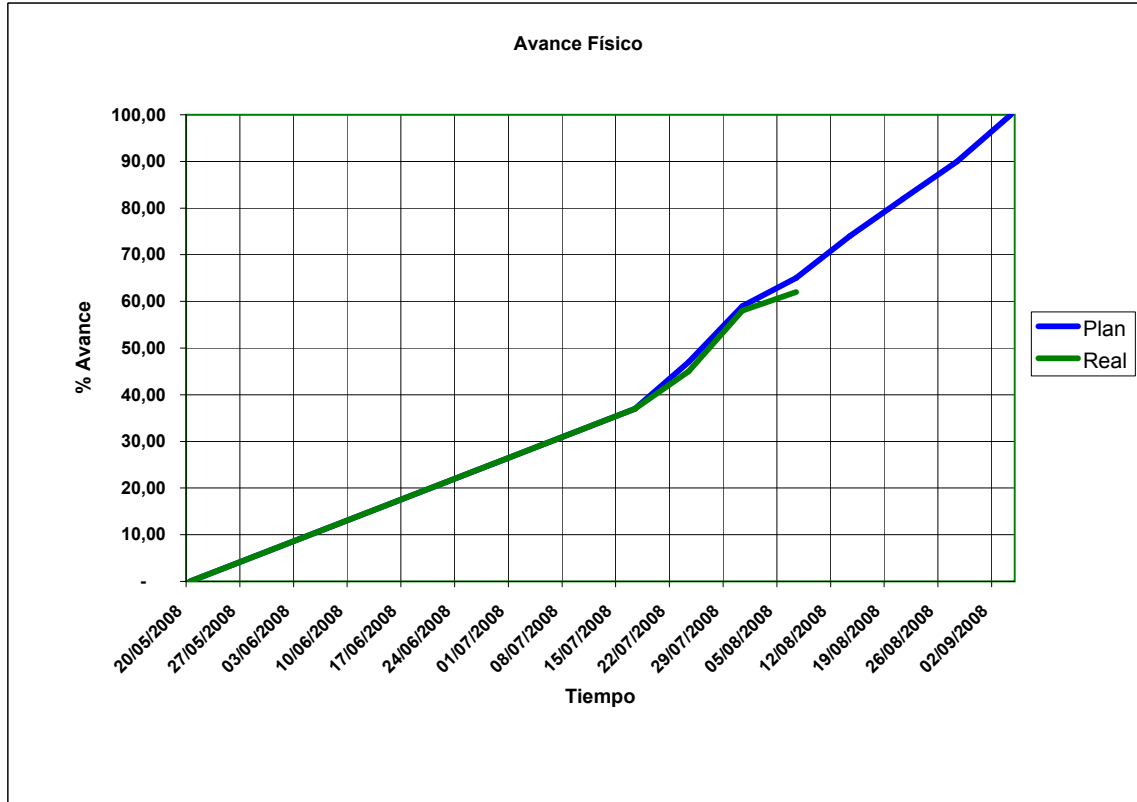

Fecha	17-jul	24-jul	31-jul	7-ago	14-ago	21-ago	28-ago	4-sep		
Programado	37,00	47,00	59,00	65,00	74,00	82,00	90,00	100,00		
Real	37,00	45,00	58,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Leyenda	
	Desviación <= 5%
	Desviación > 5% y Desviación <= 10%
	Desviación > 10%
