



CINES UNIDOS
REPORTE PERIODO: 27 Ago al 02 Sep



¿Qué pasó? (Actividades realizadas desde el último seguimiento):

- Sólo se trabajó en el nuevo formulario de contacto
- Se llevó a cabo adiestramiento de personal Cines Unidos en Módulo de Contacto

¿Qué debería haber pasado?


- Haber finalizado el nuevo formulario
- Haber ajustado la integración con Sitio Web con las listas de valores de Ciudad, Estado y Cinesas reales
- Limpieza de tablas en Pippin y puesta en producción del Módulo de Contacto luego de pruebas de certificación por parte de Cines Unidos
- Tener un 95% de la integración con Transacciones Web

¿Por qué tenemos una diferencia entre lo que pasó y lo que debería haber pasado? (Incluir Áreas de Atención)

- Retrasos en el nuevo formulario del Módulo de Contacto

¿Qué debemos hacer para mantenernos dentro del Plan? (Próximas Actividades y Responsables)

- Sigue pendiente:
 Obtener listas de valores
 Obtener diccionario de datos de la tabla de transacciones
- A menos que se replanifique será imposible recuperar el retraso

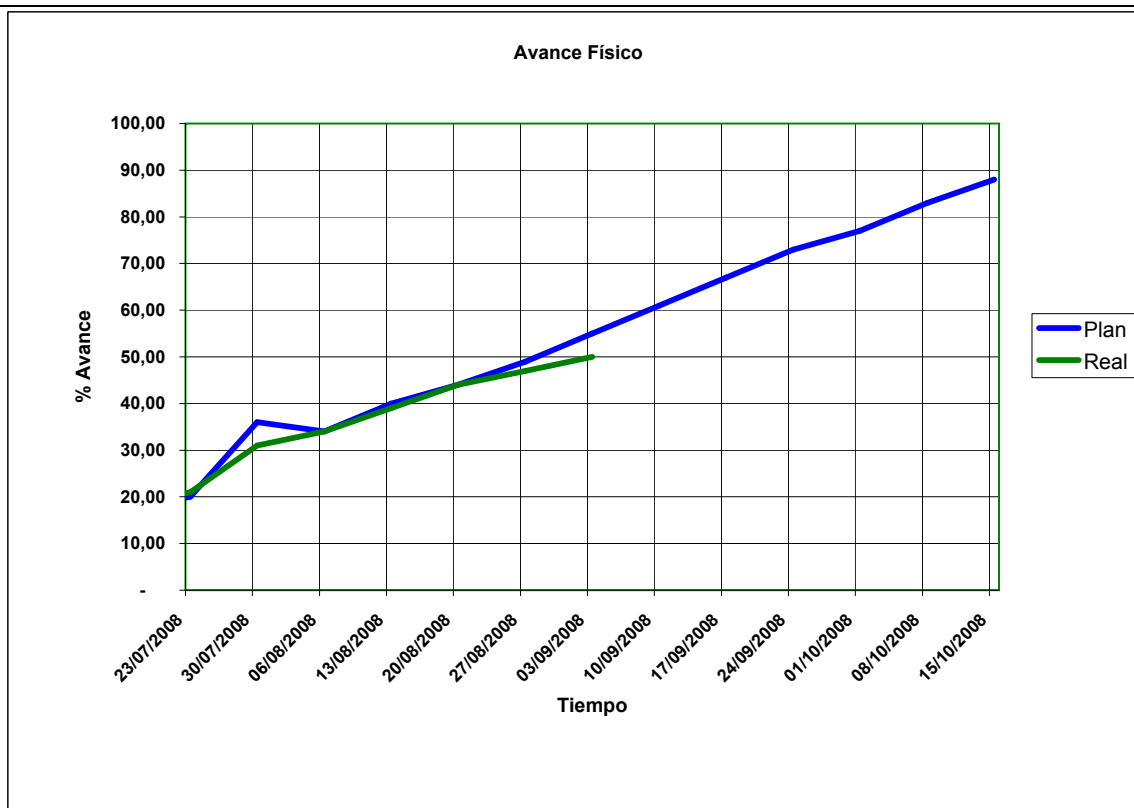

Fecha	23-jul	30-jul	6-ago	13-ago	20-ago	27-ago	3-sep	10-sep	17-sep	24-sep
Programado	20,00	36,00	34,00	40,00	44,00	49,00	55,00	61,00	67,00	73,00
Real	21,00	31,00	34,00	39,00	44,00	47,00	50,00	0,00	0,00	0,00



Fecha	1-oct	8-oct	15-oct							
Programado	77,00	83,00	88,00							
Real	0,00	0,00	0,00							

Replanificación

Leyenda	
	Desviación ≤ 5%
	Desviación > 5% y Desviación ≤ 10%
	Desviación > 10%
