



CINES UNIDOS  
REPORTE PERIODO: 13 Ago al 19 Ago



¿Qué pasó? (Actividades realizadas desde el último seguimiento):

- Se finalizó integración con sitio web, asumiendo listas de valores (aun no recibidas)
- Se finalizó integración Tiendas
- Se hizo análisis del .mdb de transacciones (se requiere diccionario de datos)
- Se hizo replanificación - con cambio en formulario de contacto para sitio web

¿Qué debería haber pasado?


N/A

¿Por qué tenemos una diferencia entre lo que pasó y lo que debería haber pasado? (Incluir Áreas de Atención)

N/A

¿Qué debemos hacer para mantenernos dentro del Plan? (Próximas Actividades y Responsables)

- Obtener listas de valores
- Obtener diccionario de datos de la tabla de transacciones

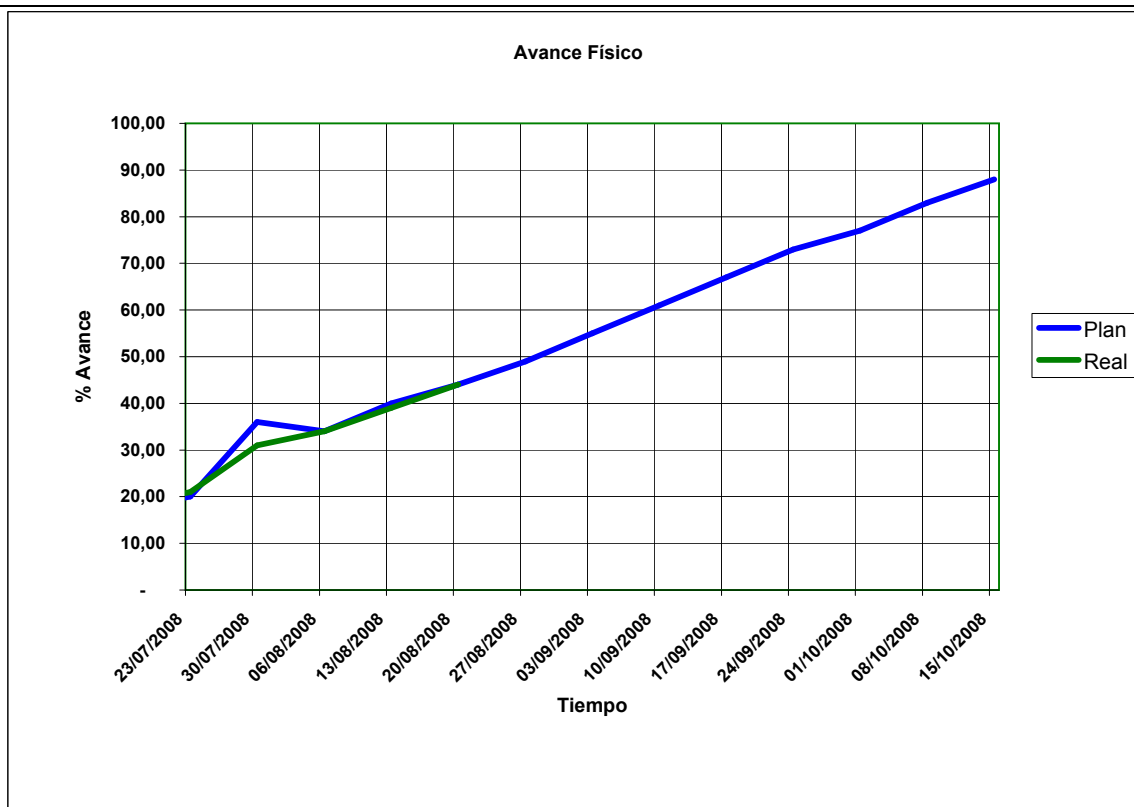

| Fecha      | 23-jul | 30-jul | 6-ago | 13-ago | 20-ago | 27-ago | 3-sep | 10-sep | 17-sep | 24-sep |
|------------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|
| Programado | 20,00  | 36,00  | 34,00 | 40,00  | 44,00  | 49,00  | 55,00 | 61,00  | 67,00  | 73,00  |
| Real       | 21,00  | 31,00  | 34,00 | 39,00  | 44,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |



| Fecha      | 1-oct | 8-oct | 15-oct |  |  |  |  |  |  |  |
|------------|-------|-------|--------|--|--|--|--|--|--|--|
| Programado | 77,00 | 83,00 | 88,00  |  |  |  |  |  |  |  |
| Real       | 0,00  | 0,00  | 0,00   |  |  |  |  |  |  |  |

Replanificación

| Leyenda |                                        |
|---------|----------------------------------------|
|         | Desviación  <= 5%                      |
|         | Desviación  > 5% y  Desviación  <= 10% |
|         | Desviación  > 10%                      |
